

MONTAGE-AUFTRAG vom 09.12.2024

Nr. 241093

Firma: Format 4pro GmbH
Frau / Herrn: Format 4pro GmbH
Bauvorhaben: Mainzer Str. 3, 96123 Pödelndorf
Kommission: BV Korporaal Haustür

Telefon: 09505 - 80 76 88 00

KW 30

Ansprechpartner: Rainer Martin
Tel: 0951/ 70080-32

Montagetermin: 24/07/25

Kostenstelle: T1917

BAUSTELLENADRESSE:

Format4pro
Mainzer Str. 3
96123 Litzendorf
Tel.: 09505

lfdm-Umfang: 0,00 m
Stückzahl: 2 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: FA JESUS VEGA am 09.12.2024

Bemerkungen / Zubehör:

2x HT SANIERUNG

(MONTAGE ERST NACH DER FENSTER
MONTAGE)

HAUSTÜROFFNUNGEN WERDEN BAUSEITIG
GENÜCHTET !

Lagerbestellungen

Stk.

JNOTHERM HT 2stk KW 51

+ MONTAGEMATERIAL S. LISTE

Baustellenanlieferung

Stk.

-
-
-

Montageauftrag erteilt:

Sonstiges

Bautür
Bauschild



MAGNAT
Bauelemente GmbH
Villachstraße 1 - 96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 700 800
Fax: 0951 / 700 8088

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Mainzer Str. 3, 96123 Pödelndorf
Baustellenadresse: 96123 Litzendorf Mainzer Str. 3
Auftrag Nr.: 241093
Kommission: BV Korporaal Haustür
Bauherr: Format 4pro GmbH, Schlemmerwiesen 9, 96123 Litzendorf

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Meterrisse vorhanden: _____	Ja / Nein
alle Elemente montiert und funktionsfähig: _____	Ja / Nein
Befestigung der Stulpelemente oben + unten geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Elemente mit HT-Schwelle nach Meterriss montiert: _____	Ja / Nein
Einbautiefe Fenster/ Türen geprüft: _____	Ja / Nein
AFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
IFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
alle Rollladen/ Raffstore montiert und überprüft: _____	Ja / Nein
VSR mit Kurbelbedienunge und Kurbellänge geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Schlagregendichtheit zwischen RFS und Rahmen: _____	Ja / Nein
Überstand der Rollo-/ Raffstorekästen geprüft: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaukleber entfernt: _____	Ja / Nein
Mängel wie Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Gewerke Loch geschlossen: _____	Ja / Nein
alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (_____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauleiters/ Bauherr/ Auftraggeber

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Unterschrift Monteur

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Montageanweisung



Kommission: RM_FirmaFormat4-HAT				Datum: 01.10.2024			
Auftragsnummer: 241093				Aufmaßtechniker: C. Wunsch			
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür		Parkmöglichkeit X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	X	Lagerfläche X
Altbau	Demontage		Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand		Etage/Fahrstuhl EG/KG
	Demontage bauseits	X	Entsorgung Mulde Hof		Vlies		Bautreppe/Gerüst
Montage nach Stand der Technik							
	<u>Außen</u>		<u>Mitte</u>		<u>Innen</u>		<u>Bemerkung</u>
Oben			Trioplex				
	Twinaktiv	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Li / Re			Trioplex				
	Twinaktive	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fensterbank	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv		
	Twinaktiv		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv		
	bauseits	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
HST oben	Twinaktiv		Soudal blau		Twinaktiv		Verschraubung Würth
HST seitlich			Trioplex				
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
HST unten	Twinaktiv		Schaum				
Verleistung	innen 3-seitig		innen 2-seitig		außen seitlich		Flachleiste mm Farbe
	innen 4-seitig		innen unten		außen unten		Renoleiste mm Farbe
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen-dichtung		Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank		
Rollomontage							
Vorsatz			Panzer Bestand		Panzer		
Aufsatz			Motoren Bestand		Motoren		
Sturzkasten Bestand			Rollodeckel Bestand		Rollodeckel		
Rollozubehör			Rollogurt		DIHA Gurtdurchführung		
			Einlass-Gurtwickler		Blende		Größe:
					Schwenkwickler		Größe:
			Rollowelle		Doppelbocklager		
Raffstore			Vorsatz		Schienen		
			Schachtmontage		Seil		
			freitragend				

Checkliste Material

Datum: 21.11.2024

Auftragsnummer:		241093		Kommission:		RM_FirmaFormat4-HAT			Lager
	Typ	Stk.		Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware	geprüft:
Haustür		2		Inotherm	30.09.2024	29.10.2024	51		
Folie unten	Twin Aktiv 100mm	30lfm		Lager					
Montageschaum	Allseason-Schaum 1K	2		Lager					
Montagekleber	illbruck SP351 anthrazit	1		Lager					
Primer	Sprühprimer	3		Lager					
Bauwinkel	Knelsen 40x90x2,5	10		Lager					
Montageschrauben	AMO 7,5x182	30		Lager					
Bauschild	Ja	1		Lager					



Aufmaß Haustür:

☒ Altbau

Datum: 21.10.2024

BV: 241093 RM-Format4

DIN ☒ L ☐ R FFB: _____ mm

Alter Stock: Holz

Durchgangslichte: 965

Fußbodenheizung ☐

Innen:

Verleistung ☐

Abfugen ☐

Einputzen
bauseits ☒



Höhe:
2190

Breite: 2970

Außen:

Verleistung ☐

Abfugen ☐

Einputzen
Bauseits ☒





Höhe:
2250

Breite: 2980

Versatz: unten: -65

oben: 0

seitlich: -5



1160
1020



Bestellmaß:

2950x2150 +BEP 10

Montage:

Glasbausteine werden entfernt

Arbeiten bauseits:

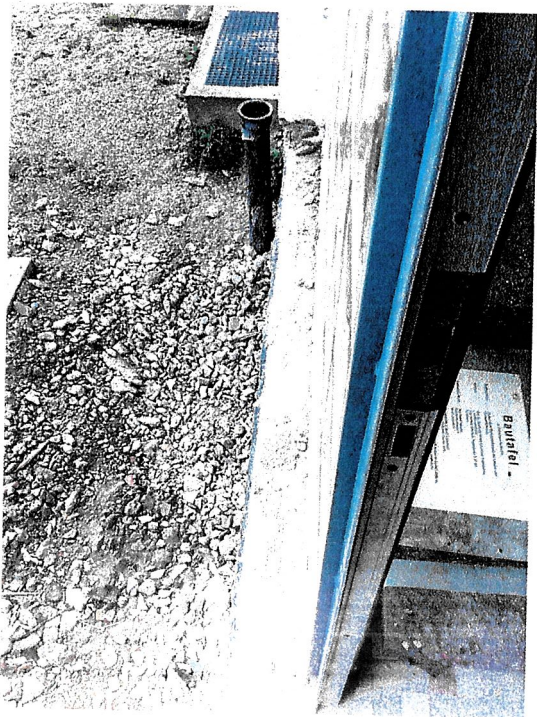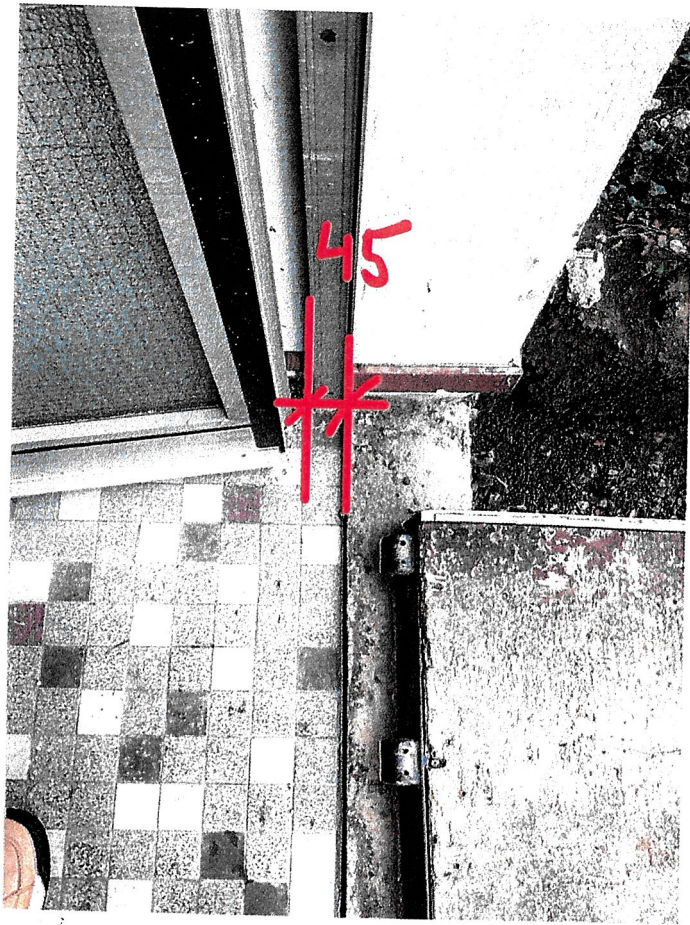

INOTHERM

Inotherm d.o.o., Prigorica 98
SI- 1331 Dolenja vas, SLOWENIEN




Tel: ++386 1 835 07 45
patricija.grobnik@inotherm.si

Patricija Grobnik

Auftragsbestätigung: N30374B / 30.09.2024

Prigorica 30.09.2024

Außenansicht

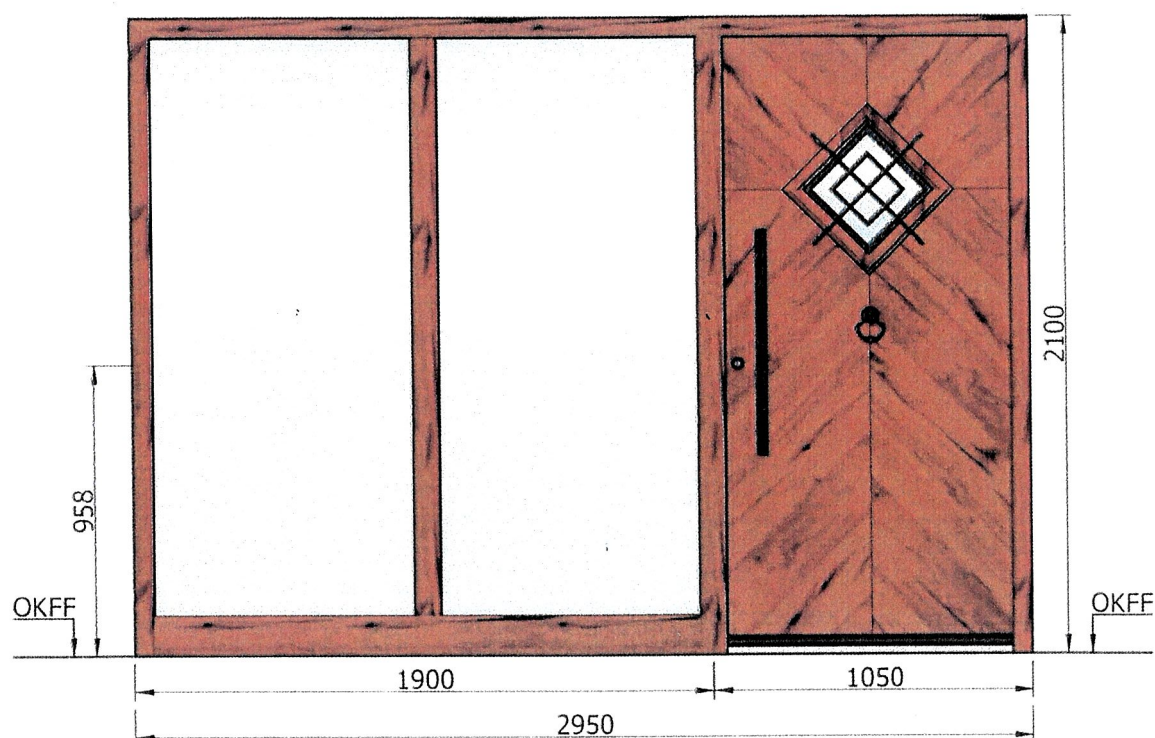

ACHTUNG! Aus technischen Gründen sind in dieser Darstellung Abweichungen zu den Originalprodukten möglich.
Produktänderungen vorbehalten.

Auftragsbestätigung: N30374C / 30.09.2024

Prigorica 30.09.2024

Außenansicht

