

...wenn's um IHR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax: 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 15.11.2024

Nr. 241025

Firma: Hartmann, Sebastian
Frau / Herrn Sebastian Hartmann
Bauvorhaben: Himmelreichstr. 10, 96120 Bischberg
Kommission: Fenster, Rollläden

Telefon: 0170 4065544

~ 8⁰⁰ Uhr

Ansprechpartner: Thomas Kämper
Tel: 0951/ 70080-32

Montagetermin:

AB 07/01/25

Kostenstelle: T1616
Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

BAUSTELLENADRESSE:

Hartmann
Himmelreichstr. 10
96120 Bischberg
Tel.: 0170 4065544

Montage Saffer
Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 92,18 m
Stückzahl: 24 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: TA VEGA am 15.11.2024

Bemerkungen / Zubehör: FE- MONTAGE SAN

CONTAINER BENEDIKT 0951 42793

Lagerbestellungen

	Stk.
EGE FE	17 Stk
AMON FE-BLECH	14 Stk
AMON GRIPPE	16 Stk
ROHA VSR	1 Stk
ROHA ROLLOPANZEN	17 Stk
SOMEY	13 Stk
ROHODECKEL	3 Stk
ROHOWELLE	4 Stk
TELESKOP WELLE	13 Stk

Sonstiges

Bautür
Bauschild

IT-MATERIAL SIEHE LISTE

Baustellenanlieferung

	Stk.
KW 50 - LIEFERUNG NACH BAMBERG	-
KW 49	-
KW 49	-
KW 49	-
KW 49	-
KW 46	-
KW 49	-
KW 49	-
KW 49	-

Montageauftrag erteilt:



MAGNAT

Bauelemente GmbH
Villachstraße 1 - 96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 700 800
Fax: 0951 / 700 8088

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Himmelreichstr. 10, 96120 Bischberg
Baustellenadresse: 96120 Bischberg Himmelreichstr. 10
Auftrag Nr.: 241025
Kommission: Fenster, Rollläden
Bauherr: Sebastian Hartmann, Schulstraße 24, 96120 Bischberg

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Meterrisse vorhanden: _____	Ja / Nein
alle Elemente montiert und funktionsfähig: _____	Ja / Nein
Befestigung der Stulpelemente oben + unten geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Elemente mit HT-Schwelle nach Meterriss montiert: _____	Ja / Nein
Einbautiefe Fenster/ Türen geprüft: _____	Ja / Nein
AFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
IFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
alle Rollläden/ Raffstore montiert und überprüft: _____	Ja / Nein
VSR mit Kurbelbedienung und Kurbellänge geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Schlagregendichtheit zwischen RFS und Rahmen: _____	Ja / Nein
Überstand der Rollo-/ Raffstorekästen geprüft: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt: _____	Ja / Nein
Mängel wie Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Gewerke Loch geschlossen: _____	Ja / Nein
alle Griffbolzen und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauleiters/ Bauherr/ Auftraggeber

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Unterschrift Monteur

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Montageanweisung



Kommission: TK_Hartmann-FE-Rollo				Datum: 13.09.2024			
Auftragsnummer: 241025				Aufmaßtechniker: C. Wunsch			
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür	Parkmöglichkeit	X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	X Lagerfläche	X
Altbau	Demontage	X	Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand	Etage/Fahrstuhl	EG/OG
	Demontage bauseits		Entsorgung Mulde Hof	X	Vlies	Bautreppe/Gerüst	
Montage nach Stand der Technik							
	Außen		Mitte		Innen		Bemerkung
Oben			ISO-Bloco Reno	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Li / Re			ISO-Bloco Reno	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fensterbank	Twinaktiv	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
	Twinaktiv		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv		
	bauseits	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
HST oben	Twinaktiv	X	Soudal blau	X	Twinaktiv	X	Verschraubung Würth
HST seitlich			ISO-Bloco Reno	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
HST unten	Twinaktiv	X	Schaum	X			
Verleistung	innen 3-seitig		innen 2-seitig		außen seitlich	Flachleiste mm	
	innen 4-seitig		innen unten		außen unten	Renoleiste mm	
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen-dichtung	X	Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank		
Rollomontage							
Vorsatz	X	Panzer Bestand		Panzer	X		
Aufsatz		Motoren Bestand		Motoren	X		
Sturzkasten Bestand	X	Rollodeckel Bestand		Rollodeckel	X		
Rollozubehör		Rollogurt	X	DIHA Gurtdurchführung	X		
		Einlass-Gurtwickler	X	Blende	X	Größe: 165	
				Schwenkwickler		Größe:	
		Rollowelle	X	Doppelbocklager			
Raffstore		Vorsatz		Schienen			
		Schachtmontage		Seil			
		freitragend					

Auftragsnummer:	241025		Kommission:	TK_Hartmann-FE-Rollo			Lager Ware geprüft:
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	
Fenster		17	EGE	18.10.2024	24.10.2024	50	
Fenstergriff		16	Ammon	07.11.2024		49	
Fenstergriff abschließbar							
Fenstergriff mit Druckknopf							
Haustür							
Nebeneingangstür							
Stahltür							
AFB		14	Ammon	07.11.2024		49	
IFB							
Niederhalter Vollwärmeschutz							
Niederhalter für Putz							
Stahlwinkel							
Rollo							
Vorsatzrollo		1	Roma	11.11.2024		49	
Aufsatzrollo							
Raffstore							
Sturzkasten Außenrevision							
Sturzkasten Innenrevision							
Rollopanzer		17	Roma	11.11.2024		49	
Rollomotor und Zubehör		13	Somfy	07.11.2024		46	
Motorlager							
Kastendeckel	160mm	3	Ammon	07.11.2024		49	
Gurtwickler							
Mauerkästen							
Gurtband							
Gurtscheibe							
Gurtdurchführung							
Lager							
Lager							
Lager							
Welle	Achtkantwelle 60x0,6mm	4	Ammon	07.11.2024		49	
Teleskopwelle mit Kapsel	Ja	13	Ammon	07.11.2024		49	
Walzenkapsel							
Rollokastendämmung							
Motorbedienung							
Zubehör							
Verleistung Innen							
Verleistung Außen							
Illbruck Dämmmörtel							
Montagematerial							
Montageband o+li+re	ISO Bloco Reno	80lfm	Lager				
Folie unten	Twin Aktiv 100mm	50lfm	Lager				
Bodentief Folie unten							
Kompriband							
Montageschaum	Pistolenschaum 1K	10	Lager				
Montagekleber	Illbruck SP351 anthrazit	5	Lager				
Primer	Sprühprimer	3	Lager				
Fensterbankdichtung	UD40-25 schwarz	25lfm	Lager				
Bauwinkel	SFS JB-A 150/180	20	Lager				
Montage-Laschen							

Bestellung an:			Lieferung:		Kommission:		Sachbearbeiter:	
EGE			□ Baustelle:		241025 TK-Hartmann		C. Wunsch 0171/2945813	
zu Angebot:					Rahmenverbreiterungen geschlossen		Bankanschluss Fenster: C35-3	
von:			Liefertermin:				RFL: 65x47mm 95001 10mm ausgerückt oben +20mm unten +20mm länger montiert	
Fa. MAGNAT Villachstraße 1 96052 Bamberg			Datum: 18.10.2024				Traverse: 76802 mit Stahl montiert	
			Seite 1 von 1					
System:		Farbe:		Glas:				
Kömmerring 76AD		innen:		3-fach 0,6 W				
Rahmen:		außen:		Dübelbohrung 6,5 mm links/rechts				
Flügel:		standard						
						Alle RV mit Stahl		

Rahmenaußenmaße verstehen sich zzgl. FBA und RV!

BV:

Datum:

241025 TK-Hartmann


25.09.2024

Seite: 1

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 1 Raum: EG Gästezimmer

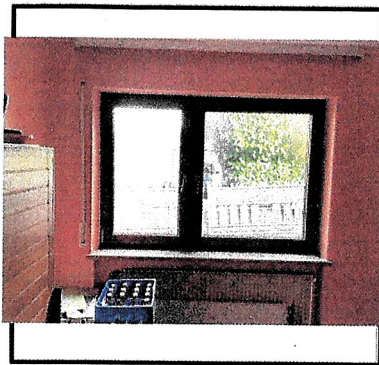


Bestellmaß:

1700x1205

+ FBA 35

+ BEP




Mittig geteilt

	Innen:	Außen:
Breite:	1720	1715
Höhe:	1210	1235

Versatz:	unten	oben	seite
	-25	0	0
AFB:	130mm		
IFB:			
Rollo-deckel:	160 Bestand		
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒		
VBR Sturz	Links		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Pos. 2 Raum: EG Schwimmbad

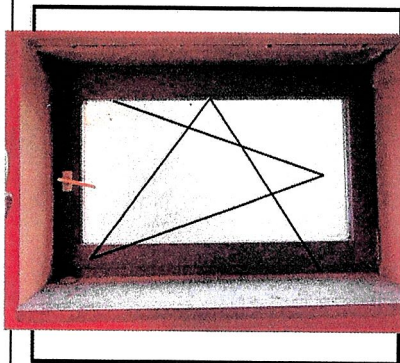

Bestellmaß:

1090x705

+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1070	1105
Höhe:	710	735

Versatz:	unten	oben	seite
	-20	-5	-20
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:	160 Bestand		
Gurt-wickler:	165		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Laibung beschneiden

BV:

241025 TK-Hartmann

Datum:


25.09.2024



Seite: 2

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 3 Raum: EG Schwimmbad

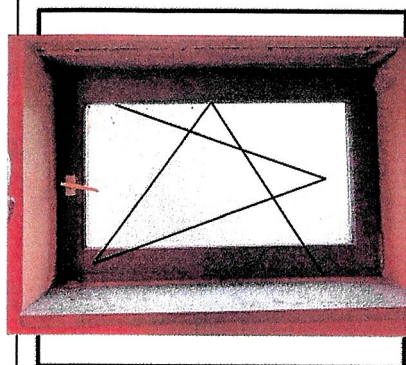

Bestellmaß:

1090x705

+ FBA 35


+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1080	1090
Höhe:	710	735

Versatz:	unten	oben	seite
	-20	-5	-10
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:	160 Bestand		
Gurt-wickler:	165		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Laibung beschneiden

Pos. 4 Raum: EG Schwimmbad WC

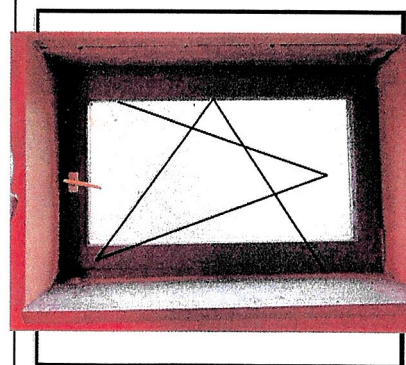

Bestellmaß:

1090x705

+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1090	1095
Höhe:	710	735

Versatz:	unten	oben	seite
	-20	-5	0
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:	160 Bestand		
Gurt-wickler:	165		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Laibung beschneiden

BV:

241025 TK-Hartmann

Datum:


25.09.2024

Seite: 3

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 5 Raum: EG Büro

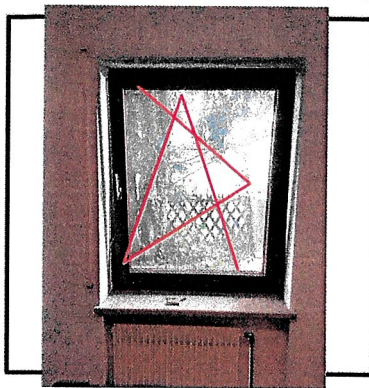

Bestellmaß:

950x1205

+ FBA 35

+ BEP

Versatz:

unten	oben	seite
-20	0	0

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:
VBR SturzAntrieb: G ☐ M ☒

Links

Verglasung:

RV:

unten	oben	seite

	Innen:	Außen:
Breite:	970	980
Höhe:	1210	1235

Pos. 6 Raum: OG Ankleide



Bestellmaß:

950x1205

+ FBA 35

+ BEP

Versatz:

unten	oben	seite
-25	0	5

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:
VBR SturzAntrieb: G ☐ M ☒

Rechts

Verglasung:

RV:

unten	oben	seite

	Innen:	Außen:
Breite:	970	965
Höhe:	1210	1245

BV:

Datum:

241025 TK-Hartmann


25.09.2024

Seite: 4

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 7 Raum: OG Kind1

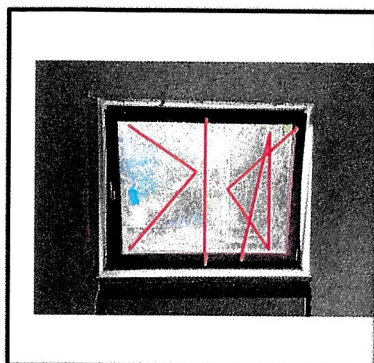

Bestellmaß:

1450x1205


+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1470	1445
Höhe:	1210	1245

Versatz:	unten	oben	seite
	-25	-10	10
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒		
VBR Sturz	Links		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Pos. 8 Raum: OG Kind2

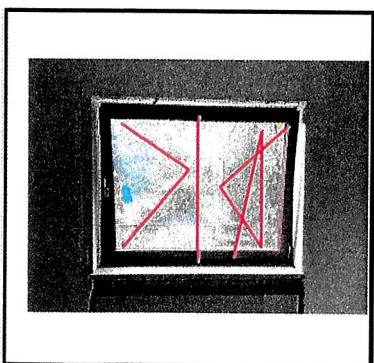

Bestellmaß:

1450x1205

+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1475	1450
Höhe:	1210	1245

Versatz:	unten	oben	seite
	-25	-5	20
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒		
VBR Sturz	Links		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

BV:

241025 TK-Hartmann

Datum:

25.09.2024


Seite: 5

Aufmaß Fenster Altbau



Fenster - Türen - Wintergärten

Pos. 9 Raum: OG Bad

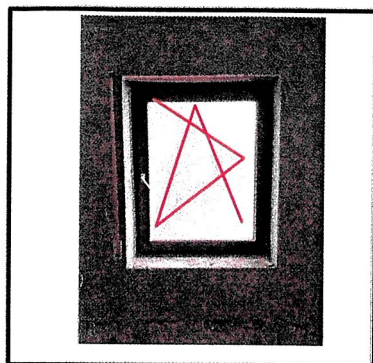

Bestellmaß:

950x1205


+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	975	965
Höhe:	1210	1230

Versatz:	unten	oben	seite
	-30	10	10
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒		
VBR Sturz	Links		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Pos. 10 Raum: OG WC

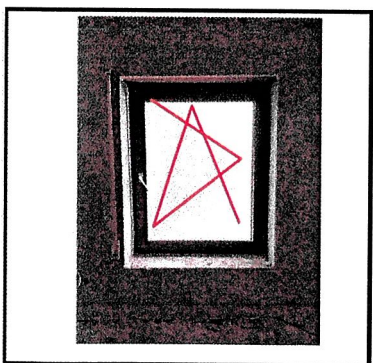

Bestellmaß:

950x1205

+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	970	975
Höhe:	1210	1235

Versatz:	unten	oben	seite
	-25	0	-5
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒		
VBR Sturz	Rechts		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

BV:

Datum:

241025 TK-Hartmann


25.09.2024



Seite: 6

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 11 Raum: OG Schlafzimmer

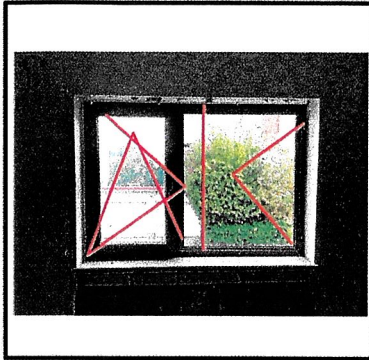

Bestellmaß:

1700x1205


+ FBA 35

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1720	1710
Höhe:	1210	1235

Versatz:	unten	oben	seite
	-20	0	5
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G	☐	M ☒
VBR Sturz	Links		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Pos. 12 Raum: OG HWR

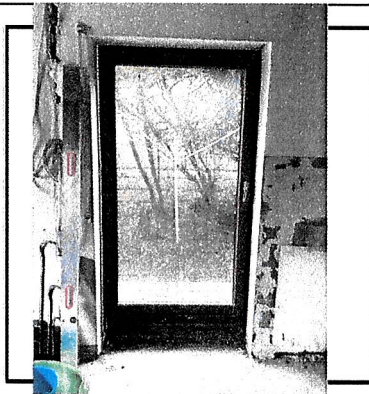


Bestellmaß:

1090x2065

+ FBA

+ BEP 90



	Innen:	Außen:
Breite:	1110	1105
Höhe:	2175	2135

Versatz:	unten	oben	seite
	45	0	0
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo:	Antrieb: G	☐	M ☒
VBR Sturz	Links		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Flachschwelle,

IS Pendeltür

BV:

241025 TK-Hartmann




Datum:

25.09.2024

Seite: 7

Aufmaß Fenster Altbau

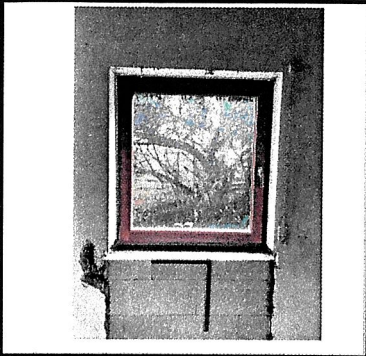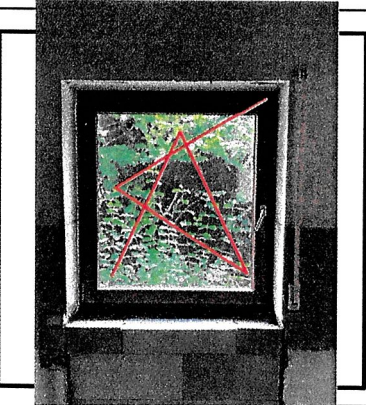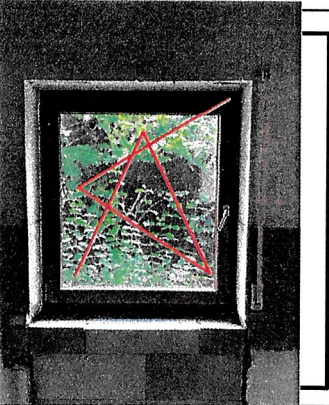

Pos. 13	Raum: OG Küche											
	Bestellmaß: 1080x1105 + FBA 35 + BEP _____ +RV 100 unten		Versatz: unten oben seite 0 5									
			AFB:									
			IFB:									
			Rollo-deckel:									
		Gurt-wickler:	Rollo: Antrieb: G ☐ M ☒									
		VBR Sturz	Links									
		Verglasung:										
		RV: unten oben seite										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Innen:</th> <th>Außen:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breite:</td> <td>1100</td> <td>1095</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1210</td> <td>1240</td> </tr> </tbody> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1100	1095	Höhe:	1210	1240		
	Innen:	Außen:										
Breite:	1100	1095										
Höhe:	1210	1240										
IS Spannrahmen Innenliegend												
Pos. 14	Raum: OG Küche											
	Bestellmaß: 1080x1205 + FBA 35 + BEP _____		Versatz: unten oben seite 0 5									
			AFB:									
			IFB:									
			Rollo-deckel:									
		Gurt-wickler:	Rollo: Antrieb: G ☐ M ☒									
		VBR Sturz	Rechts									
		Verglasung:										
		RV: unten oben seite										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Innen:</th> <th>Außen:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breite:</td> <td>1100</td> <td>1090</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1210</td> <td>1240</td> </tr> </tbody> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1100	1090	Höhe:	1210	1240		
	Innen:	Außen:										
Breite:	1100	1090										
Höhe:	1210	1240										
IS Spannrahmen Innenliegend												

BV:

Datum:

241025 TK-Hartmann


25.09.2024

Seite: 8

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 15 Raum: OG Wohnen

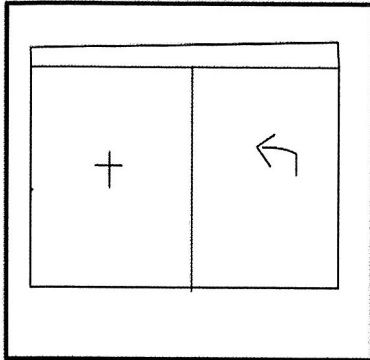**Bestellmaß:**
 4000x2525 + FBA
 + BEP 90

RV oben 50mm

 Links 1560
 1155
 Rechts 1545


	Innen:	Außen:
Breite:	4020	
Höhe:		

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐
VBR Sturz	
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

VBR mittig geteilt, Unterkante Kasten = Oberkante HEST ohne RV

2-Flügelige Pendeltür

Pos. 16 Raum: OG Wohnen

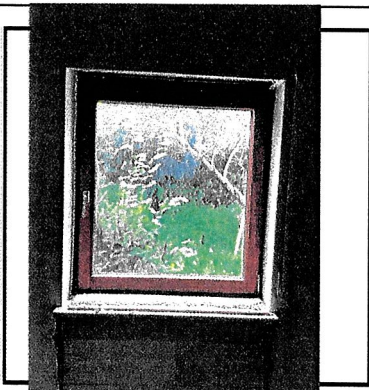**Bestellmaß:**
 1080x1205 + FBA 35
 + BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1100	1095
Höhe:	1210	1240

Versatz:	unten oben seite
	-25 10 0
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒
VBR Sturz	Links
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

IS Spannrahmen Innenliegend

BV:

Datum:



241025 TK-Hartmann

25.09.2024

Seite: 9

Aufmaß Fenster Altbau

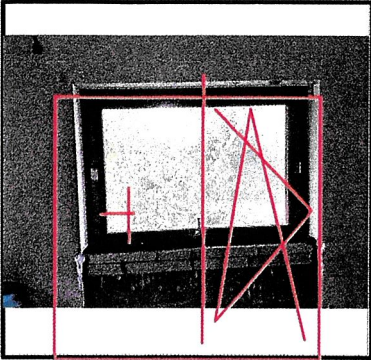



Pos.	17	Raum:	OG Wohnen																																													
 Bestellmaß: 1700x2055 + FBA _____ + BEP <u>90</u> 1055 X 1120 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1725</td> <td style="text-align: center;">1715</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">2160</td> <td></td> </tr> </table>						Innen:	Außen:	Breite:	1725	1715	Höhe:	2160																																				
	Innen:	Außen:																																														
Breite:	1725	1715																																														
Höhe:	2160																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Versatz:</td> <td style="width: 15%;">unten</td> <td style="width: 15%;">oben</td> <td style="width: 15%;">seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☐ M ☒</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Links</td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Versatz:	unten	oben	seite		-30	10	10	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒			VBR Sturz	Links			Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																													
	-30	10	10																																													
AFB:																																																
IFB:																																																
Rollo-deckel:																																																
Gurt-wickler:																																																
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☒																																															
VBR Sturz	Links																																															
Verglasung:																																																
RV:	unten	oben	seite																																													
Flachschwelle																																																
IS Pendeltür																																																
Pos.		Raum:																																														
 Bestellmaß: + FBA _____ + BEP _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Innen:	Außen:	Breite:			Höhe:																																					
	Innen:	Außen:																																														
Breite:																																																
Höhe:																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Versatz:</td> <td style="width: 15%;">unten</td> <td style="width: 15%;">oben</td> <td style="width: 15%;">seite</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Versatz:	unten	oben	seite	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite								
Versatz:	unten	oben	seite																																													
AFB:																																																
IFB:																																																
Rollo-deckel:																																																
Gurt-wickler:																																																
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐																																															
VBR Sturz																																																
Verglasung:																																																
RV:	unten	oben	seite																																													

EG



HEST

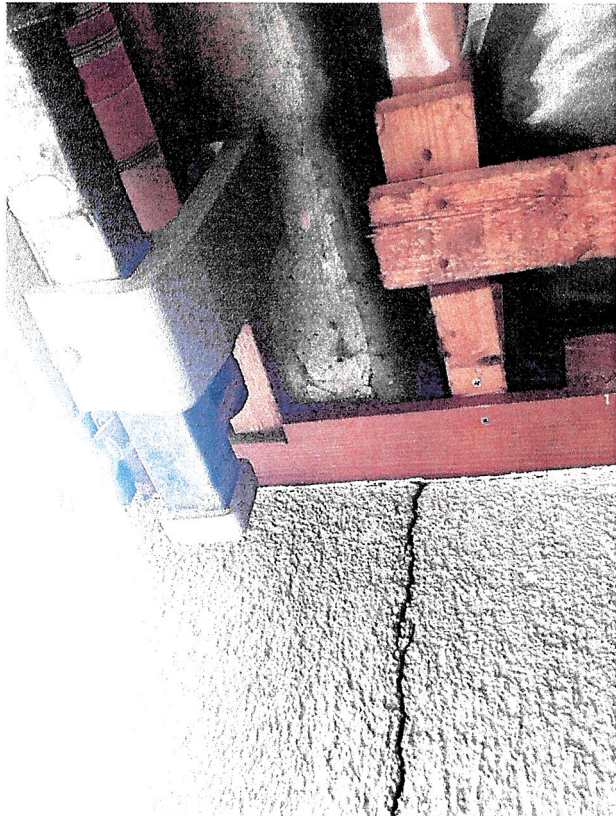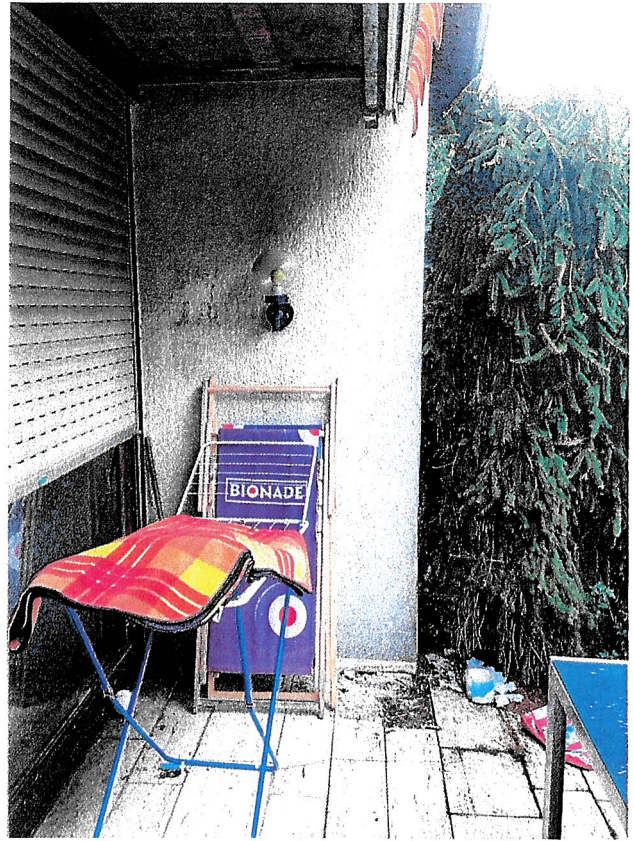

M.T.:7.2.2012



An: Ammon

Von: Magnet

Fax:

Datum: 11.11.24

Telefon:

Seiten:

Betreff: Bestellung

Cc:

Com: 241025 TK-Hartmann

Nr.:

Alubänke GS 40 ☒	Alubänke GS 25 ☐	KF400 ☒	KF250 ☐	S 6 ☐	S 7 ☐
EV1 ☒	Weiß ☐	G 214 ☐	G 216 ☐	RAL ☐	Antidröhn ☒

Position:	Stück:	Länge:	Ausladung:	
Flr Gast	1	1755	150	
Flr Schwim Links	1	1145	"	
Flr Schwim Rechts	1	1130	"	
Flr Schwim WC	1	1135	"	
Flr Büro	1	1020	"	
OG Ankleide	1	1005	"	
OG Kind 1	1	1485	"	
OG Kind 2	1	1480	"	
OG Bad	1	1005	"	
OG WC	1	1015	"	
OG Schlafn	1	1750	"	
OG Küche Li	1	1130	"	
OG Küche Re	1	1130	"	
OG Wohnen	1	1135	"	

Lieferung Lager Bbg.

MAGNAT Bauelemente GmbH
Völkstr. 1, Ecke Mammelsdorfer Str.
96052 Bamberg
Tel 09 51/700 000
Fax 09 51/700 0088
E-Mail: info@magnet-fenster.de
IBAN: DE06 7 35 0000 0300 0441 46

Verkaufsniederlassung
Völkstr. 1, Ecke Mammelsdorfer Str. 251
81827 München
Tel. 089/43 66 68 3
Fax 089/43 66 68 44
www.magnet-fenster.de
SWIFT-BIC: BYLADEM1SKB

Sparkasse Bamberg
Konto 300 044 146
BLZ 770 500 00

Oberbank Bamberg
Konto 1511-1032 18
BLZ 701 277 00

KW 49

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz Bamberg
HR B 4053
Geschäftsführer: Wilfried Kämper
UST ID NR. DE 203 614 045
Finanzamt Bamberg
Steuer-Nr. 20713200167

Fenster
machen
Häuser

