

...wenn's um IHR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax: 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 12.05.2025

Nr. 250401

Firma: Postler Bau GmbH
Frau / Herrn: Postler Bau GmbH
Bauvorhaben: Weißbergstr. 5 - Neuhausen
Kommission: Utzmann FE&RO

Telefon: 09544-94200

Ansprechpartner: Dietmar Schmittbüttner
Tel: 0951/ 70080-25

Montagetermin:

10/06/25

Kostenstelle: T1105
Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

BAUSTELLENADRESSE:

Fam. Utzmann
Weißbergstr. 5
96170 Neuhausen

lfdm-Umfang: 0,00 m
Stückzahl: 1 Stk.

BL: HR KONJUNKTION

Montageauftrag erteilt an Monteur: _____ am 12.05.2025

Bemerkungen / Zubehör:

FE - MONTAGE

(AMMON MACHT DIE ANDICHTUNG
AN DEN BODENTIEFEN FENSTERN)

Lagerbestellungen

Baustellenanlieferung

	Stk.		Stk.
EGE-FENSTER WERDEN AUF DIE BAUSTELLE GELIEFERT		KW 23	
ROMA KW 22	-		-
AMMON KW 22	-		-
M-MATERIAL SIEHE LISTE	-		-

Montageauftrag erteilt:

Sonstiges

Bautür
Bauschild



MAGNAT
Bauelemente GmbH
Villachstraße 1 - 96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 700 800
Fax: 0951 / 700 8088

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Weißbergstr. 5 - Neuhausen
Baustellenadresse: 96170 Neuhausen Weißbergstr. 5
Auftrag Nr.: 250401
Kommission: Utzmann FE&RO
Bauherr: Postler Bau GmbH, Hauptstr. 1, 96169 Lauter

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Meterrisse vorhanden: _____	Ja / Nein
alle Elemente montiert und funktionsfähig: _____	Ja / Nein
Fenstereinstellung übergeprüft: _____	Ja / Nein
Befestigung der Stulpelemente oben + unten geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Elemente mit HT-Schwelle nach Meterriss montiert: _____	Ja / Nein
Einbautiefe Fenster/ Türen geprüft: _____	Ja / Nein
AFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
IFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
alle Rollläden/ Raffstore montiert und überprüft: _____	Ja / Nein
VSR mit Kurbelbedienung und Kurbellänge geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Schlagregendichtheit zwischen RFS und Rahmen: _____	Ja / Nein
Überstand der Rollo-/ Raffstorekästen geprüft: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaukleber entfernt: _____	Ja / Nein
Mängel wie Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Gewerke Loch geschlossen: _____	Ja / Nein
alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauleiters/ Bauherr/ Auftraggeber

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Unterschrift Monteur

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Inbetriebnahmeprotokoll über manuell und elektrisch angetriebenen Rollo - und Raffstoreanlagen

Firma: Postler Bau GmbH
Frau / Herrn Postler Bau GmbH
Bauvorhaben: Weißbergstr. 5 - Neuhausen
Auftrag Nr.: 250401
Kommission: Utzmann FE&RO
Ansprechpartner: Dietmar Schmittbüttner
Tel: 0951/ 70080-25

BAUSTELLENADRESSE:

Fam. Utzmann
Weißbergstr. 5
96170 Neuhausen

Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

Monteur: - _____ **am** 12.05.2025

**Beim Probelauf sind Panzer und Lamellen auf Beschädigungen zu prüfen!
Es ist zu prüfen, ob der Behang bis zur Endlage fährt - auch bei Gurt!**

Bestätigung über durchgeführten Probelauf aller Elemente ohne Mängel:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Probelauf konnte nicht durchgeführt werden, weil:

Mängel bei folgenden Pos.:


Montageanweisung




Kommission: Utzmann FE&RO				Datum: 16.04.2025			
Auftragsnummer: 250401				Aufmaßtechniker: CW			
Neubau	3-fach Verglasung	X	Kran benötigt	Bautür	X	Parkmöglichkeit	X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort	Bauschild		Lagerfläche	X
Altbau	Demontage		Entsorgung Mulde Bst.	Staubwand		Etage/Fahrstuhl	EG/OG
	Demontage bauseits		Entsorgung Mulde Hof	Vlies		Bautreppe/Gerüst	X
Montage nach Stand der Technik							
	<u>Außen</u>		<u>Mitte</u>		<u>Innen</u>	<u>Bemerkung</u>	
Oben			Trioplex	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Li / Re			Trioplex	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fensterbank	Twinaktiv	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
	Twinaktiv		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv		
	bauseits	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
HST oben	Twinaktiv	X	Soudal blau	X	Twinaktiv	X	Verschraubung Würth
HST seitlich			Trioplex	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
HST unten	Twinaktiv	X	Schaum	X			
Verleistung	innen 3-seitig		innen 2-seitig		außen seitlich	Flachleiste	mm
	innen 4-seitig		innen unten		außen unten	Renoleiste	mm
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen-dichtung	X	Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank		
Rollomontage							
Vorsatz			Panzer Bestand		Panzer	X	
Aufsatz			Motoren Bestand		Motoren		
Sturzkasten Bestand			Rollodeckel Bestand		Rollodeckel		
Rollozubehör			Rollogurt	X	DIHA Gurtdurchführung		
			Einlass-Gurtwickler	X	Blende	Größe:	
					Schwenkwickler	Größe:	
			Rollowelle		Doppelbocklager		
Raffstore			Vorsatz		Schienen		
			Schachtmontage	X	Seil		
			freitragend				

Auftragsnummer:	250401		Kommission:	DS_Utzmann FE&RO			Lager Ware geprüft:
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	
Fenster		18	EGE	24.04.2025	28.04.2025	23	
Fenstergriff	Magnat F9	17	Lager				
AFB		16	Ammon	30.04.2025		22	
Rollo							
Raffstore		2	Roma	30.04.2025		22	
Rollopanzer/Zubehör		16	Roma	30.04.2025		22	
Montagematerial							
Montageband o+li+re	illbruck triplex 72/10-20	90lfm	Lager				
Folie unten	Twin Aktiv 100mm	50lfm	Lager				
Montageschaum	Pistolenschaum 1K	5	Lager				
Montagekleber	illbruck SP351 anthrazit	2	Lager				
Montagekleber	illbruck SP025 grau	2	Lager				
Primer	Sprühprimer	2	Lager				
Bauwinkel	SFS JB-W 120/60	20	Lager				
Bauwinkel	Knelsen 40x90x2,5	20	Lager				
Montage-Laschen	Knelsen V-Lochschiene 200x15x2	20	Lager				
Montageschrauben	AMO 7,5x182	110	Lager				
Fensterbankschrauben	3,9x25 Natur	50	Lager				
Schrauben für Bauwinkel	SPAX 5,0x40	40	Lager				
Schrauben für Bauwinkel	AMO 7,5x52	40	Lager				
HST-Verschraubung	Würth-Verschraubung	4	Lager				

Auftragsnummer:	250401		Kommission:		DS_Utzmann FE&RO			Lager
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:	
Sonstiges								
Bautür		1	Lager					



SCHEIBE $2 \times 2 \text{ m}$
GEWICHT CA 200 KG

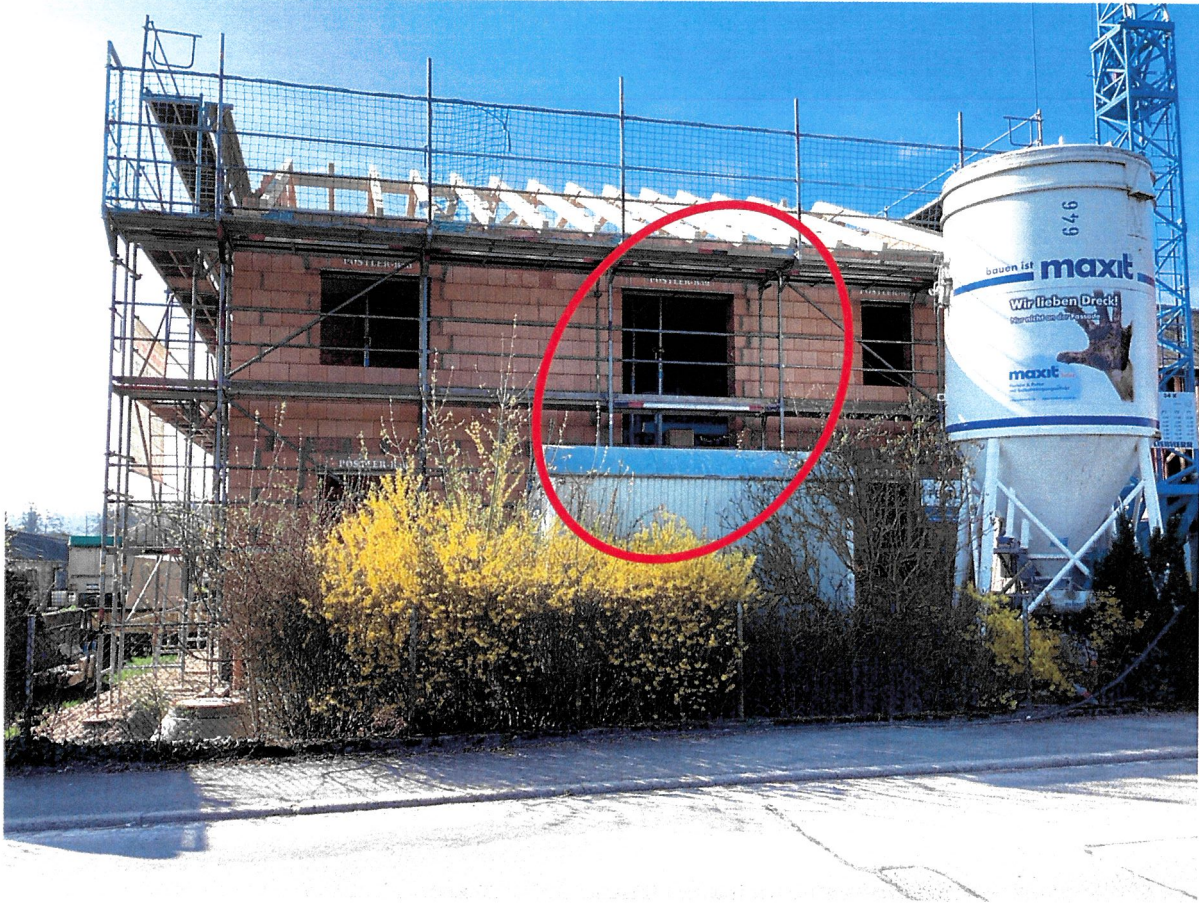

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann

Datum: 11.04.2025



Seite: 1

Aufmaß Fenster Neubau

Pos. 1		Raum: EG Büro	
	Bestellmaß BR:		
	Bestellmaß:		
	Breite RBM:	1510	
	Höhe RBM:	1455	
		inkl. BA	_____
		inkl. BEP	_____
		Art:	
		AFB:	
		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
		Raffstore:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
		Bedienung:	L ☐ R ☐
		Glas:	
		Meterriss:	O U

Pos. 2		Raum: EG Büro	
	Bestellmaß BR:		
	Bestellmaß:		
	Breite RBM:	890	
	Höhe RBM:	2450	
		inkl. BA	_____
		inkl. BEP	_____
		Art:	
		AFB:	
		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
		Raffstore:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
		Bedienung:	L ☐ R ☐
		Glas:	
		Meterriss:	O 1300 U 1155

BV:



250401 DS-Postler-Utzmann


Datum: 11.04.2025



Seite: 2

Aufmaß Fenster Neubau

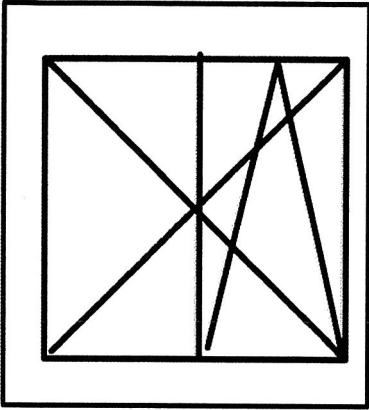Pos. 3	Raum: EG Schlafen
	Bestellmaß BR: 
Bestellmaß: 	inkl. BA _____ inkl. BEP _____
Breite RBM: 1515	
Höhe RBM: 1455	
Art:	
AFB:	
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Raff-store:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Be-dienung:	L ☐ R ☐
Glas:	
Meterriss:	O  U 

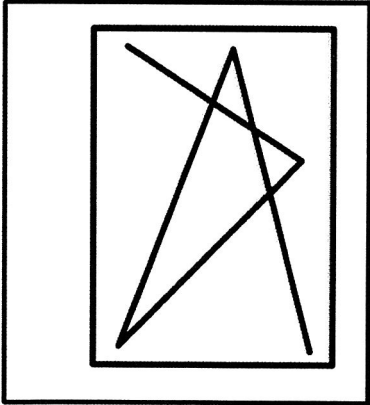Pos. 4	Raum: EG Bad
	Bestellmaß BR: 
Bestellmaß: 	inkl. BA _____ inkl. BEP _____
Breite RBM: 300	
Höhe RBM: 1455	
Art:	
AFB:	
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Raff-store:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Be-dienung:	L ☐ R ☐
Glas:	Satinato
Meterriss:	O  U 

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann

Datum: 11.04.2025



Seite: 3

Aufmaß Fenster Neubau

Pos. 5	Raum: EG Essen
	Bestellmaß BR:
Bestellmaß:	inkl. BA _____ inkl. BEP _____
Breite RBM: 3260	
Höhe RBM: 2455	
Art:	
AFB:	
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐
Raff-store:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☒
Be-dienung:	L ☐ R ☐
Glas:	
Meterriss:	O 1295 ▼ U 1165 ▲

IS Plissee

Pos. 6	Raum: EG Wohnen
	Bestellmaß BR:
Bestellmaß:	inkl. BA _____ inkl. BEP _____
Breite RBM: 1515	
Höhe RBM: 765	
Art:	
AFB:	
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Raff-store:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Be-dienung:	L ☐ R ☐
Glas:	
Meterriss:	O ▼ U ▲

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann

Datum: 11.04.2025



Seite: 4

Aufmaß Fenster Neubau

Pos. 7	Raum: EG Wohnen
	Bestellmaß BR:
Bestellmaß:	inkl. BA _____ inkl. BEP _____
Breite RBM: 1010	
Höhe RBM: 2460	
Art:	
AFB:	
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Raffstore:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Bedienung:	L ☐ R ☐
Glas:	
Meterriss:	O 1235 ▼ U 1160 ▲

Pos. 8	Raum: EG Wohnen
	Bestellmaß BR:
Bestellmaß:	inkl. BA _____ inkl. BEP _____
Breite RBM: 1515	
Höhe RBM: 1485	
Art:	
AFB:	
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Raffstore:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Bedienung:	L ☐ R ☐
Glas:	
Meterriss:	O ▼ U ▲

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann

Datum: 11.04.2025



Seite: 5

Aufmaß Fenster Neubau

Pos. 9	Raum: EG HWR		
		Art:	
Bestellmaß BR: 		AFB:	
Bestellmaß: 		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Breite RBM:	890	Raff-store:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Höhe RBM:	1445	Be-dienung:	L ☐ R ☐
		Glas:	
		Meterriss:	O U
Pos. 10	Raum: 1.OG Kind		
		Art:	
Bestellmaß BR: 		AFB:	
Bestellmaß: 		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
Breite RBM:	1515	Raff-store:	Antrieb: Kurbel ☐ M ☐
Höhe RBM:	1325	Be-dienung:	L ☐ R ☐
		Glas:	
		Meterriss:	O U

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann

Datum: 11.04.2025

Seite: 6

Aufmaß Fenster Neubau



Pos. 11		Raum: 1.OG Kind	
		Art:	
		AFB:	
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐	
		Raffstore: Antrieb: Kurbel ☐ M ☐	
Be- dienung:		L ☐ R ☐	
Glas:			
Meterriss:		O ▼ U ▲	
<u>Bestellmaß BR:</u> 		inkl. BA _____ inkl. BEP _____	
Breite RBM:		1515	
Höhe RBM:		1325	

Pos. 12		Raum: 1.OG Bad	
		Art:	
		AFB:	
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐	
		Raffstore: Antrieb: Kurbel ☐ M ☐	
Be- dienung:		L ☐ R ☐	
Glas:			
Meterriss:		O ▼ U ▲	
<u>Bestellmaß BR:</u> 		inkl. BA _____ inkl. BEP _____	
Breite RBM:		890	
Höhe RBM:		1325	

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann

Datum: 11.04.2025



Seite: 7

Aufmaß Fenster Neubau

Pos. 13		Raum: 1.OG Schlafen	
		Bestellmaß BR: 	
Bestellmaß:		inkl. BA _____ inkl. BEP _____	
Breite RBM: 1515			
Höhe RBM: 1330			
		Art: _____	
		AFB: _____	
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐	
		Raffstore: Antrieb: Kurbel ☐ M ☐	
		Bedienung: L ☐ R ☐	
		Glas: _____	
		Meterriss: O U	

Pos. 14		Raum: 1.OG Essen	
		Bestellmaß BR: 	
Bestellmaß:		inkl. BA _____ inkl. BEP _____	
Breite RBM: 3260			
Höhe RBM: 2330			
		Art: _____	
		AFB: _____	
		Rollo: Antrieb: G ☐ M ☐	
		Raffstore: Antrieb: Kurbel ☐ M ☒	
		Bedienung: L ☐ R ☐	
		Glas: _____	
		Meterriss: O 1180 U 1150	

Schreibe Lase im Transportrahmen

BV:

250401 DS-Postler-Utzmann


Datum: 11.04.2025

Seite: 8

Aufmaß Fenster Neubau



Pos. 15 Raum: 1.OG Wohnen

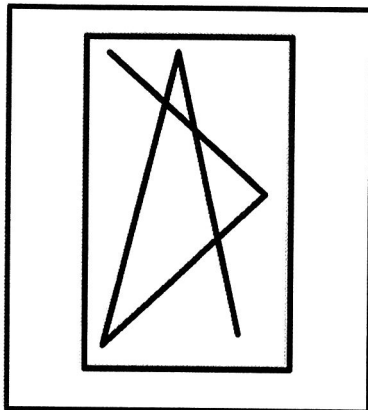

Bestellmaß BR:



Bestellmaß:



inkl. BA _____

inkl. BEP _____

Breite RBM:

1015

Höhe RBM:

2330

Art:

AFB:

Rollo:

Antrieb: G ☒ M ☐

Raff-
store:

Antrieb: Kurbel ☐ M ☐

Be-
dienung:

L ☐ R ☐


Glas:

Meterriss:

O 1175 ▼

U 1145 ▲

Pos. 16 Raum: 1.OG Küche

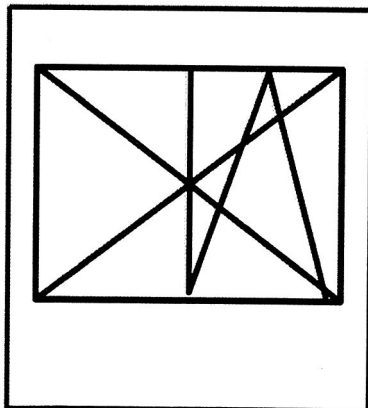

Bestellmaß BR:



Bestellmaß:



inkl. BA _____

inkl. BEP _____

Breite RBM:

1515

Höhe RBM:

1325

Art:

AFB:

Rollo:

Antrieb: G ☒ M ☐

Raff-
store:

Antrieb: Kurbel ☐ M ☐

Be-
dienung:

L ☐ R ☐

Glas:

Meterriss:

O ▼

U ▲

BV:


250401 DS-Postler-Utzmann


Datum: 11.04.2025



Seite: 9

Aufmaß Fenster Neubau

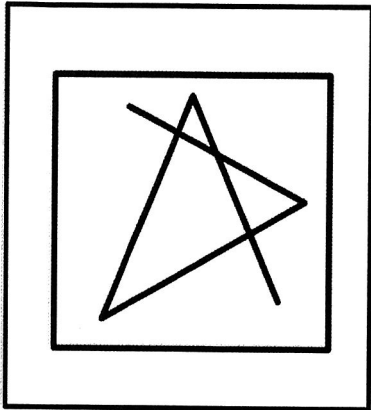Pos. 17		Raum: 1.OG HWR	
		Art:	
		AFB:	
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐	
		Raff-store: Antrieb: Kurbel ☐ M ☐	
Be-dienung: L ☐ R ☐			
Glas:			
Bestellmaß BR: 		Meterriss: O 	
Breite RBM: 890		U 	
Höhe RBM: 1335			
Bestellmaß: 		inkl. BA _____	
		inkl. BEP _____	

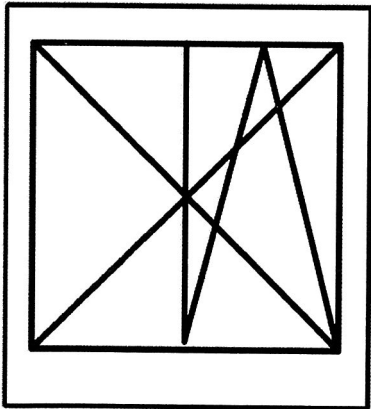Pos. 18		Raum: 1.OG Flur	
		Art:	
		AFB:	
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐	
		Raff-store: Antrieb: Kurbel ☐ M ☐	
Be-dienung: L ☐ R ☐			
Glas:			
Bestellmaß BR: 		Meterriss: O 1175 	
Breite RBM: 1760		U 1155 	
Höhe RBM: 2330			
Bestellmaß: 		inkl. BA _____	
		inkl. BEP _____	



Aufmaß Haustür/NET Neubau


Datum: 11.04.2025

BV: 250401 DS-Postler-Utzmann

DIN ☐ L ☒ R

Anschluss E-Öffner?

Mauerwerk: _____

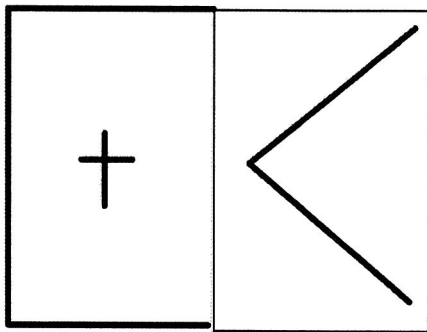

Höhe:
2465

Meterriss: **1305** 
1155 

Breite: **1635**



OKFF: _____ mm

Bestellmaß:


+BEP

Montage:

<u>Arbeiten bauseits:</u>
Abdichtung unten außen

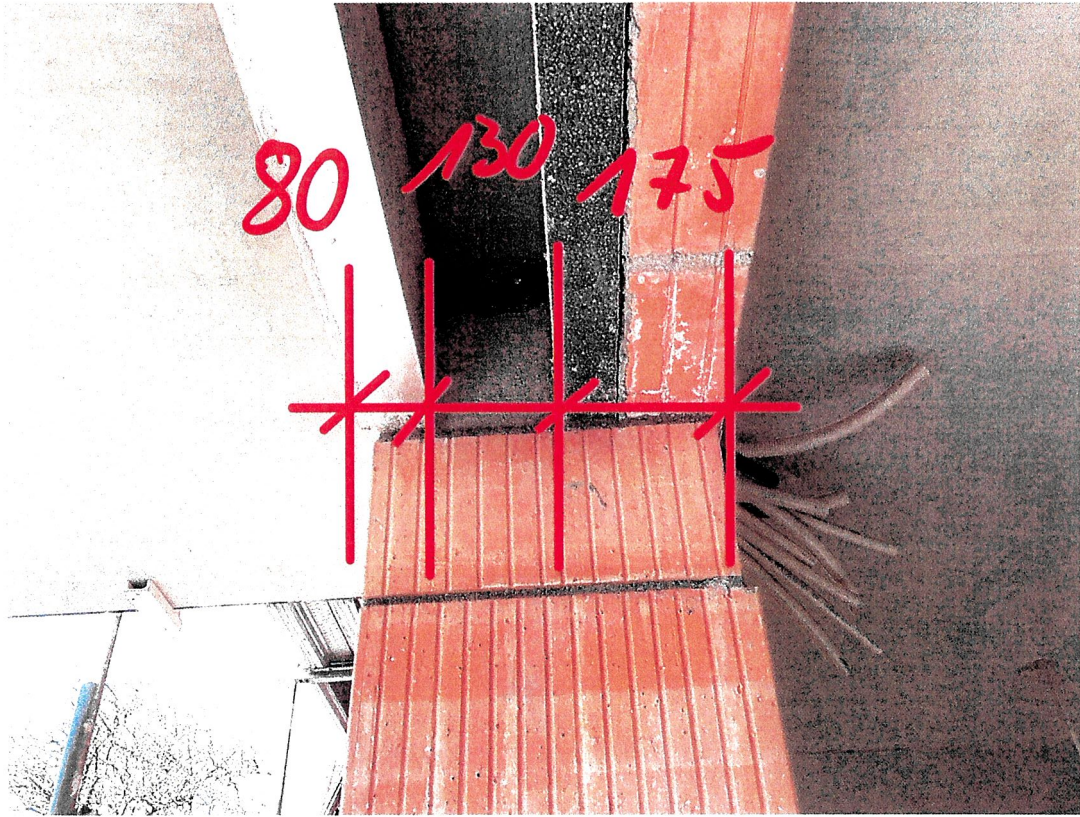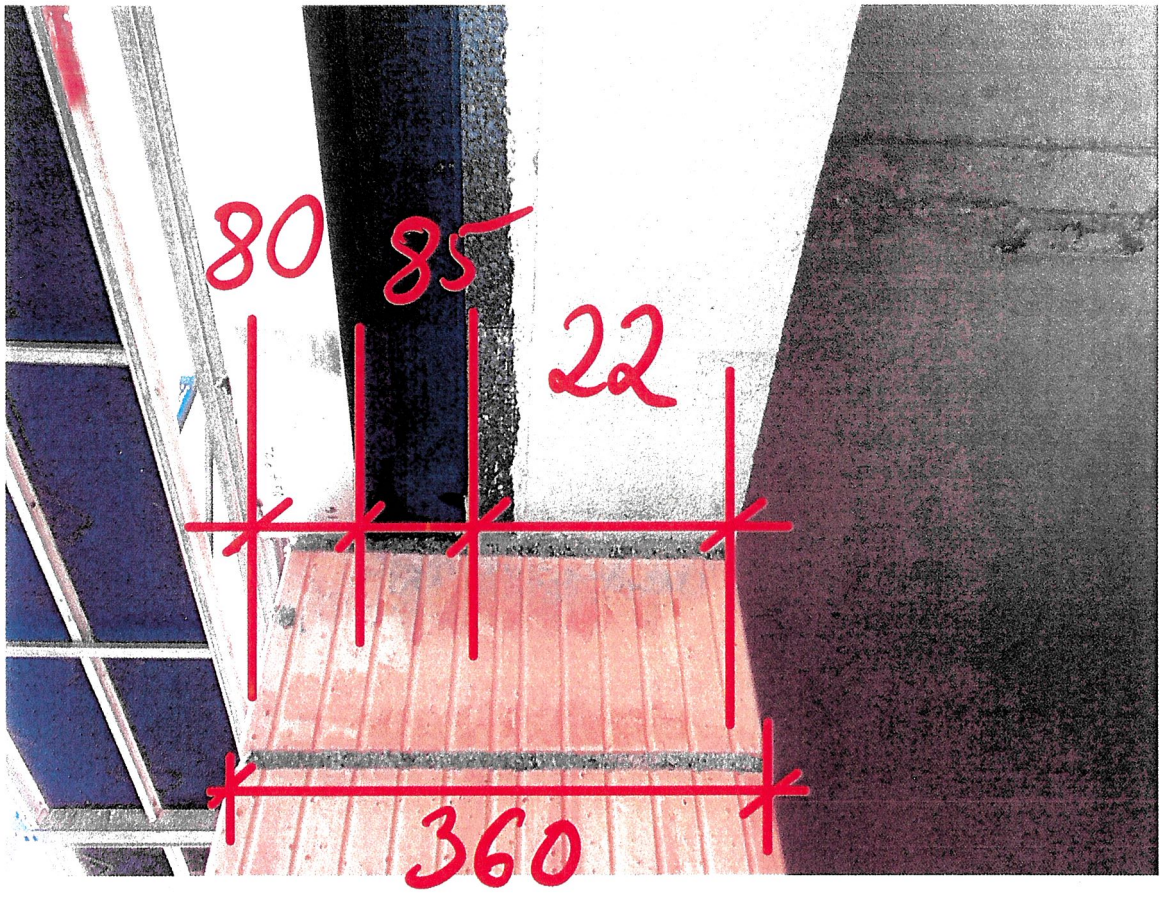



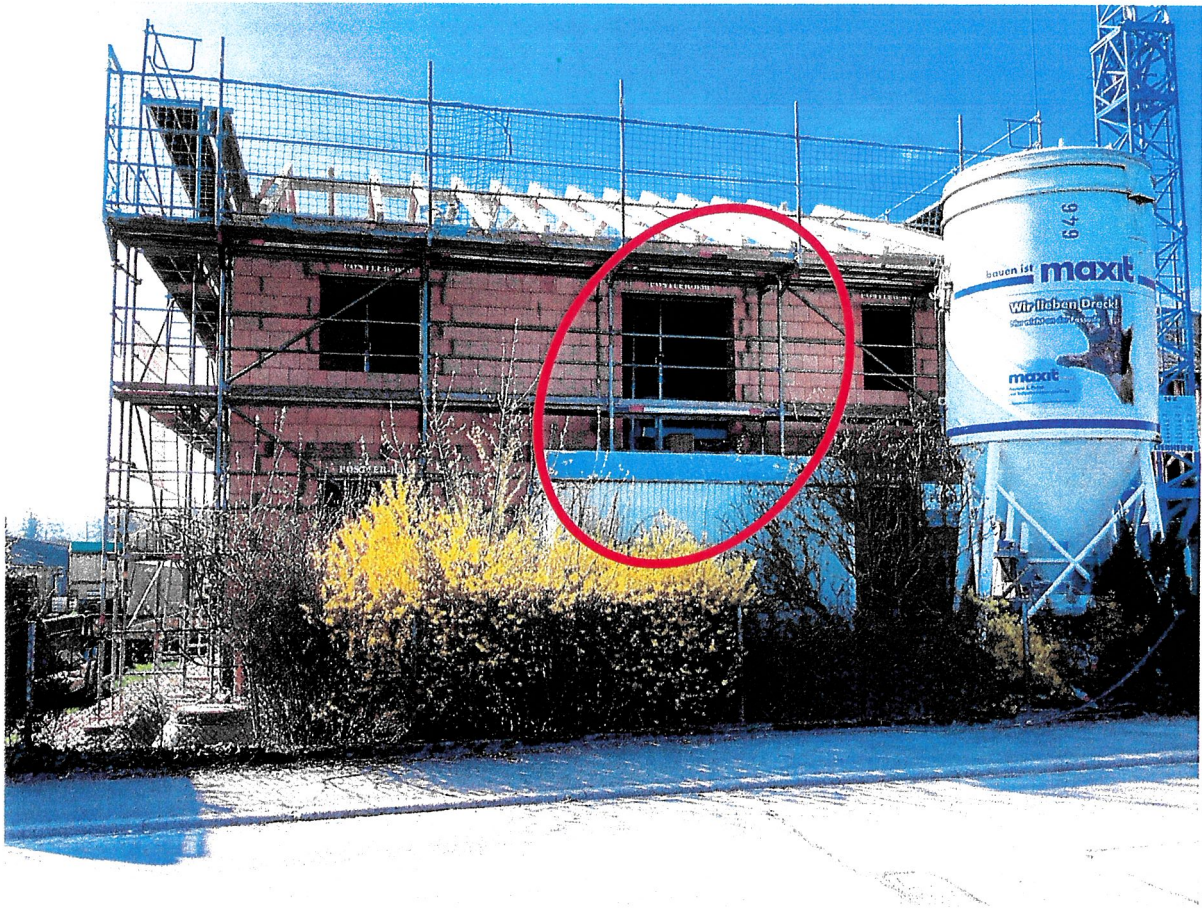

Fensterelemente mit TRAV-Glas (inkl. aller RVB) müssen zur absturzsichernden Montage nach DIN 18008- 4 geeignet sein!

Außen:	Anthrazitgrau matt	RV: mit Stahl	Glas wie Angebot
Innen:	weiß	BA: C-35	RFL: Außenrevision


Lieferanschrift: System: 76 AD

Weißbergstrasse 5, 96170 Priesendorf Rahmen:

Flügel: Standard

Datum:16.09.2024 EGE Sachbearbeiter: C.Wunsch

Fenster Pos.	Raum	Ansicht von Innen	DIN		Rohbaumaß In mm		OFF	Fenstermaß ohne Verbreiterungen		Entwässerung		FBA	RV unten	RV links	RV rechts	KPL	RV oben	RFL	Gla
			L	R	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Unten	Vorne								
1	EG Büro			X	1510	1455		1480	1395		X	C-35						X	
2	EG Büro		X		890	2450	155	860	2290		X		140					X	
3	EG Schlafen			X	1515	1455		1485	1395		X	c-35						X	
4	EG Bad		X		890	1455		860	1395		X	C-35						X	Satin
5	EG Essen			X	3260	2450		3230	2330				100						
6	EG Wohnen			X	1515	765		1485	705		X	C-35						X	
7	EG Wohnen		X		1010	2450	155	980	2290		X		140					X	
8	EG Wohnen			x	1515	1485		1485	1425		X	C-35						X	
9	EG HWR		X		890	1445		860	1385		X	C-35						X	
10	1.OG Kind			X	1515	1325		1485	1265		X	C-35						X	
11	1.OG Kind		X		1515	1325		1485	1265		X	C-35						X	
12	1.OG Bad		X		890	1325		860	1265		X	C-35						X	
13	1.OG Schlafen		X		1515	1325		1485	1265		X	C-35						X	
14	1.OG Essen			X	3260	2330		3230	2170		X		140						
15	1.OG Wohnen		X		1010	2330		980	2170		X		140					X	
16	1.OG Wohnen			X	1515	1325		1485	1265		X	C-35						X	
17	1.OG HWR		X		890	1325		860	1265		X	C-35						X	
18	1.OG Flur			X	1760	2330		1730	2170		X		140					X	
								26325	28710										

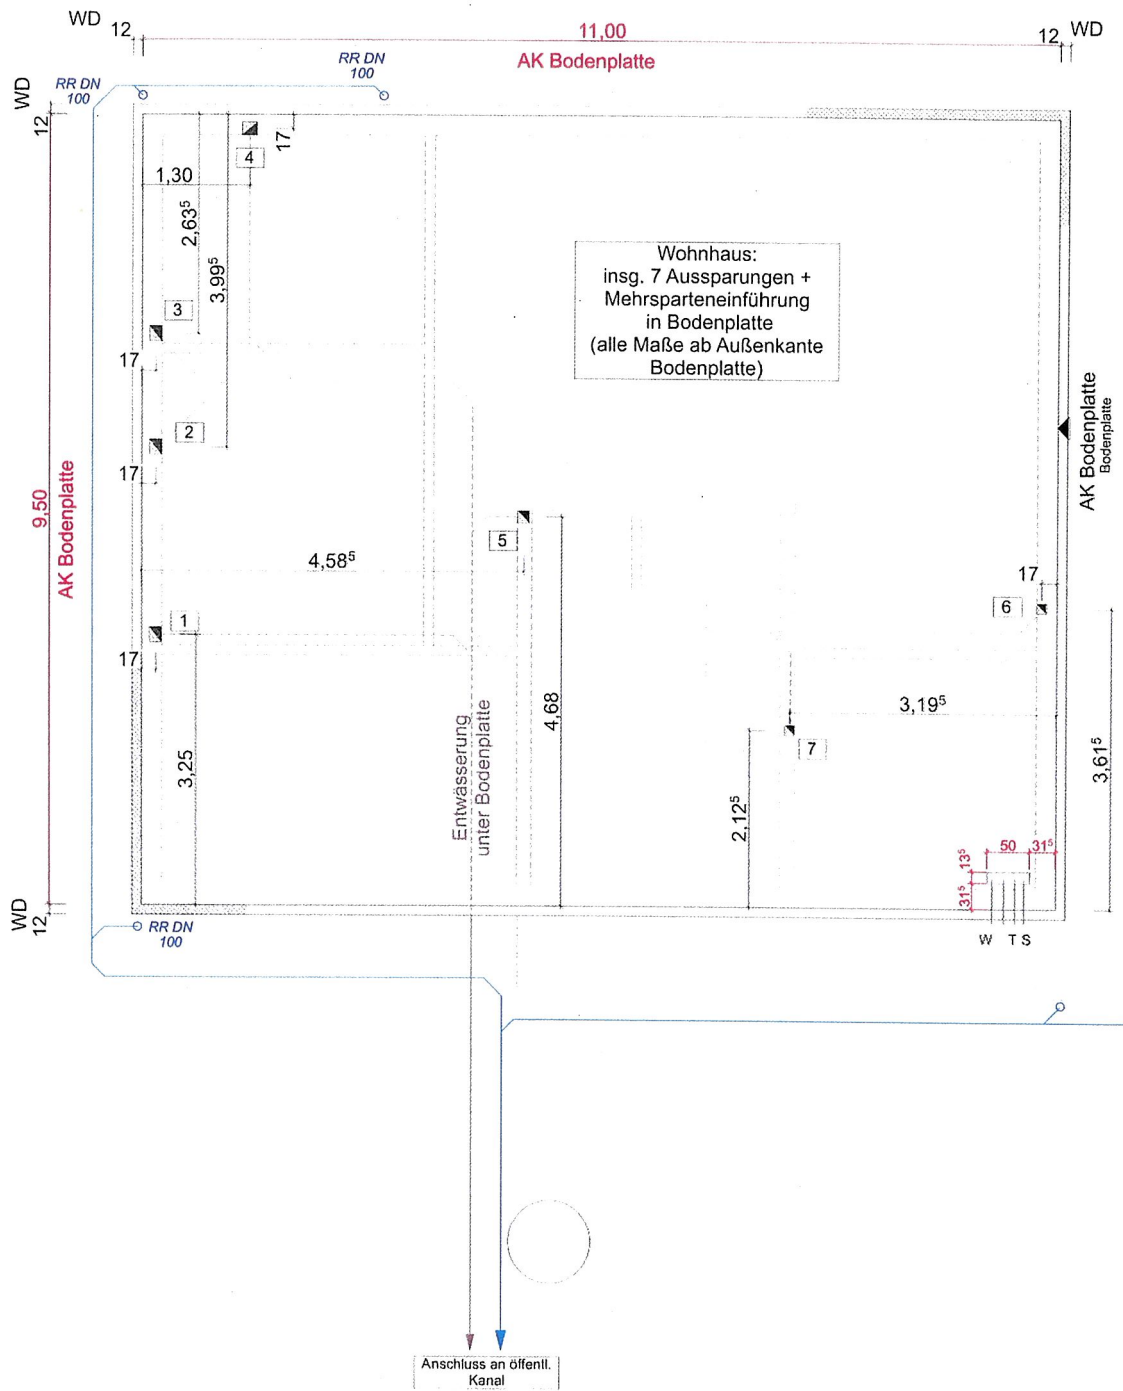

Retentionsausgleich:
(ca. 90m³)
s. Ansichten -
nur 1m angebösch
ums Haus/Carport

WS 17,5cm breit,
15cm tief,
beginnt ab OK
RFB EG
endet unter Dach

WS 17,5cm breit,
15cm tief,
beginnt ab OK
RFB EG
endet unter Dach

WS 17,5cm breit,
15cm tief,
beginnt ab OK
RFB EG
endet unter Dach

WD Außenwand
15x15cm (oder
Leerrohr)
für Abluft Ventilator
WC
-> Leerrohr bzw.
Angabe durch Fa.
Schmitt & Hahnner

Bad 7,4m²
OK RFB
OK FFB
Bodenbelag Fliesen

WS 17,5cm breit
15cm tief,
beginnt ab OK
RFB EG
endet unter Dach

Stb Stützen
(25x25)

Balkon
2,50 x 5m

Wohnen | Essen 28,8m²
OK RFB
OK FFB
Bodenbelag Vinyl/Laminat

Schlafen 11,0m²
OK RFB
OK FFB
Bodenbelag Vinyl/Laminat

Büro 11,8m²
OK RFB
OK FFB
Bodenbelag Vinyl/Laminat

WC 1,50m²

Lüfter
Abluft-WC

Flur 9,4m²
OK RFB
OK FFB
Bodenbelag Fliesen

Technik 8,0m²
OK RFB
OK FFB
Bodenbelag Fliesen

Anschluss an öffentl.
Kanal

tra
Pl
bs
H

7

8

DD
Decke EG
25cmx15cm

DD
Decke EG
25cmx15cm

RR DN
100

RR DN
100

RR DN
100

RR DN
100


RR DN
100

RR DN
100


RR DN
100

RR DN
100


RR DN
100




Schnitt

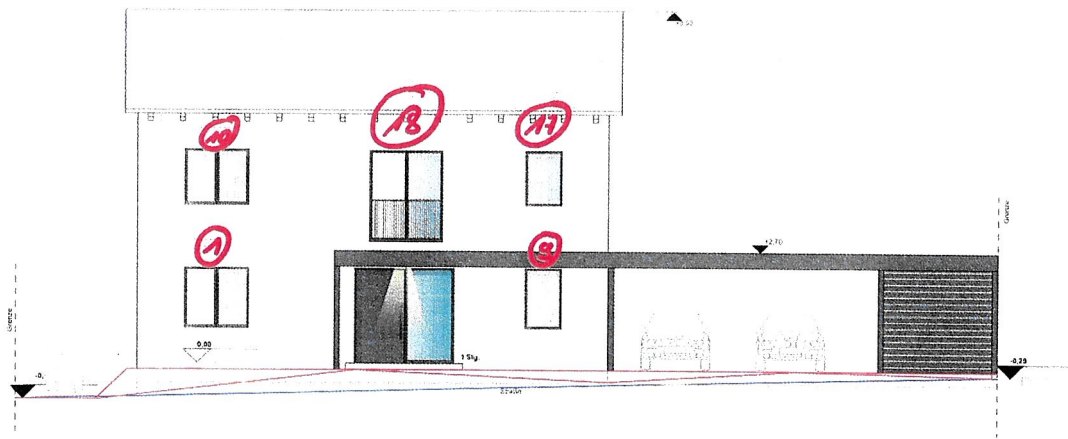


Ansicht Norden

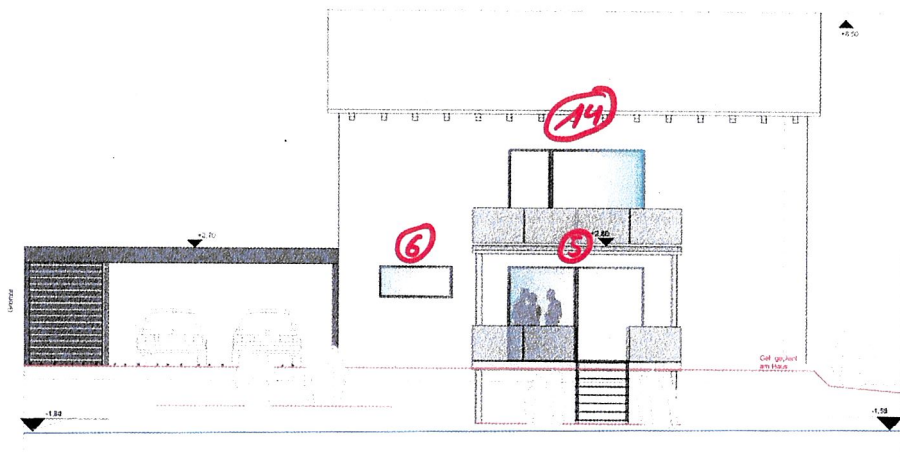

Ansicht Süden



Ansicht Osten

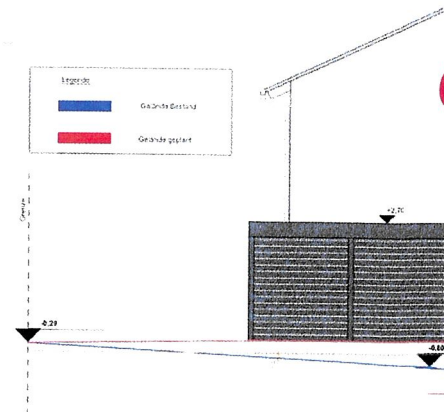

Ansicht Westen
