

MONTAGE-AUFTRAG vom 20.10.2025

Nr. 250269

Firma: 1. FC 1928 Oberhaid e. V.
Frau / Herrn 1. FC 1928 Oberhaid e. V.
Bauvorhaben: Johannishofer Straße 18, 96173 Oberhaid
Kommission: Fenster, AFB

Telefon: 09503/8254

Ansprechpartner: Rainer Martin
Tel: 0951/ 70080-32

Montagetermin: AB 27/10/25

Kostenstelle: T1917
Aufmaßtechniker: Werner Schmidt

Max. Montagezeit:

BAUSTELLENADRESSE:

1. FC 1928 Oberhaid e. V.
Johannishofer Straße 18
96173 Oberhaid
Tel.: 09503

Montage Saffer
Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 342,65 m
Stückzahl: 222 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: _____ am 20.10.2025

Bemerkungen / Zubehör: FE-MONTAGE NEUBAU
ACHTUNG -> RC-2 MONTAGE
-> BRANDSCHUTZ -MONTAGE

! MONTAGEANWEISUNG BEACHTEN !
Ø RS MIT WEIßEM SCHÜßT "

Lagerbestellungen

EGE-FENSTER KW 45
BRAND FE KW 43
ARMON KW 43
GEZE

Baustellenanlieferung

Stk.		Stk.
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-

Sonstiges

Bautür
Bauschild

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Johannishofer Straße 18, 96173 Oberhaid
Baustellenadresse: 96173 Oberhaid Johannishofer Straße 18
Auftrag Nr.: 250269
Kommission: Fenster, AFB
Bauherr: 1. FC 1928 Oberhaid e. V., Johannishofer Straße 18, 96173 Oberhaid
Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Elemente sind funktionfähig übergeben:	_____	Ja / Nein
Fenstereinstellung überprüft:	_____	Ja / Nein
Rollladen-/ Raffstorefunktion überprüft:	_____	Ja / Nein
Alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden:	_____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt:	_____	Ja / Nein
Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen:	_____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (____ Stk.) erfolgt an:	_____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben:	_____	Ja / Nein
Alle Innentüren geliefert und montiert:	_____	Ja / Nein
Alle Innentürgriffe montiert:	_____	Ja / Nein
Boden (Laminat, Fliesen, Parkett) bereits verlegt:	_____	Ja / Nein
Feuchtraumzargen ringsum versiegelt:	_____	Ja / Nein

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauherr/ Mieter/ Architekt

Unterschrift Monteur/ Firmenvertreter Magnat

Druckschrift:





Druckschrift:

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.


Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.


Fensterliste MAGNAT 1. FC Oberhaid final 27.052025

Fenster Pos.	Etage	Raum	Ansicht von Innen	DIN		Planmaß in mm		Fenstermaß (Blendrahmenmaß)		Sicherheit	Alu-FB EV1 außen		Niederhalter	V-Loch- schiene	Fenster Pos.
				L	R	Breite	Höhe	Breite	Höhe		Länge	Ausladung			
	EG	76 MD, Farbe weiß/weiß													
1	EG	Umkl. 1 Kegel		L	R	2385	885	2360	825	RC2N	2370	225	4	6	1
2	EG	Umkl. 2 Kegel		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	2
3	EG	Umkl. 1		L	R	2305	885	2280	825	RC2N	2290	225	4	6	3
4	EG	Umkl. 1		L	R	2305	885	2280	825	RC2N	2290	225	4	6	4
5	EG	Flur		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	5
6	EG	Flur		F		760	1940	735	1850	RC2	745	225	2	2	6
7	EG	Flur		F		760	1940	735	1850	RC2	745	225	2	2	7
8	EG	Flur		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	8
9	EG	Flur		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	9
10	EG	Umkl. IV Lager		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	10
11	EG	Umkl. IV Lager		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	11
12	EG	Schiri		L	R	2315	885	2290	825	RC2N	2300	225	4	6	12
13	EG	Vorber. Gastro		L	R	2385	885	2360	825	RC2N	2370	225	4	6	13
14	EG	Lebensmittel		L	R	2385	885	2360	825	RC2N	2370	225	4	6	14
15	EG	Getränke Vorrat		L	R	1510	885	1485	825	RC2N	1495	225	3	3	15
16	EG	Küche		L	Stulp	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	16
17	EG	Küche		Stulp	R	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	17
18	EG	Multi-funktions-raum		L	Stulp	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	18
19	EG	Multi-funktions-raum		Stulp	R	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	19


Fenster Pos.	Etage	Raum	Ansicht von Innen	DIN		Planmaß in mm		Fenstermaß (Blendrahmenmaß)		Sicherheit	Alu-FB EV1 außen		Niederhalter	V-Loch- schiene	Fenster Pos.
				L	R	Breite	Höhe	Breite	Höhe		Länge	Ausladung			
20	EG	Multi-funktions- raum		L	Stulp	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	20
21	EG	Multi-funktions- raum		Stulp	R	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	21
22	EG	Multi-funktions- raum		L	Stulp	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	22
23	EG	Multi-funktions- raum		Stulp	R	1510	1885	1485	1825	RC2N	1495	225	3	3	23
24	EG	Technik Kegelbahn		F		1800	1500	1775	1440		ohne		3	3	24
	DG														
25	DG			L		885	1010	860	950	RC2N	870	225	2	2	25
26	DG			L		885	1010	860	950	RC2N	870	225	2	2	26
	EG														
1	EG	WCH		F	F	2385	885	2360	810	RC2	2370	225	4	6	1
2	EG	WCD		F	F	2385	885	2360	810	RC2	2370	225	4	6	2
3	EG	Umkf. 2		F		1510	510	1485	485		ohne		94		3
3	EG	Umkf. 2		F		1510	510	1485	485		ohne				3
3	EG	Umkf. 3		F		1510	510	1485	485		ohne				3
3	EG	Sanitär 2		F		1510	510	1485	485		ohne				3
	EG	Sanierung/Aufmaß alle DIN Rechts													
27	EG	Kegel- bahn			R	1220	1480	1200	1470	RC2N	1210	240		3	27
27	EG	Kegel- bahn			R	1220	1480	1200	1470	RC2N	1210	240		3	27
27	EG	Kegel- bahn			R	1220	1480	1200	1470	RC2N	1210	240		3	27
27	EG	Kegel- bahn			R	1220	1480	1200	1470	RC2N	1210	240		3	27
27	EG	Kegel- bahn			R	1220	1480	1200	1470	RC2N	1210	240		3	27

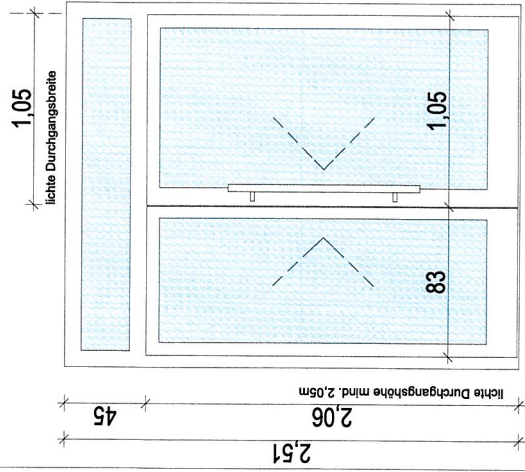


Pos. 01.001
Eingang süd
nach innen öffnend
Teilpanik

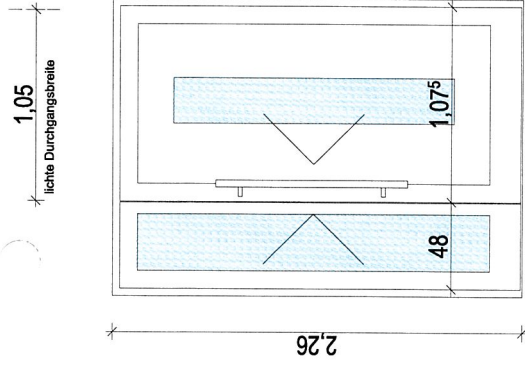


Pos. 01.003
Eingang west
nach aussen öffnend
Teilpanik

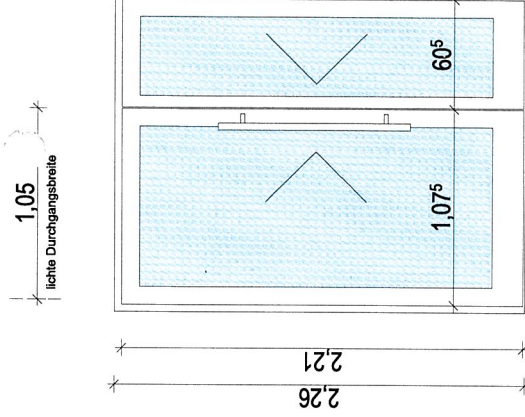


Pos. 01.005
Eingang nord
nach aussen öffnend
Vollpanik

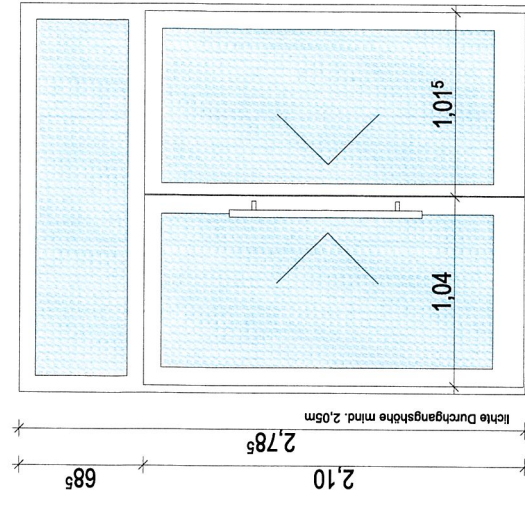


Pos. 01.011
Terrassentüren ost
nach aussen öffnend
Vollpanik

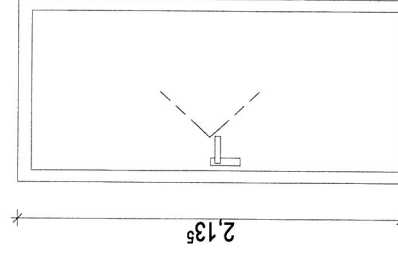

Pos. 02.002
Eingang Schiedsrichter
nach innen öffnend
T90, Stahltür



Bed. Pos. 01.007
Eingang Schiedsrichter
nach innen öffnend
T90, Aluminiumtür

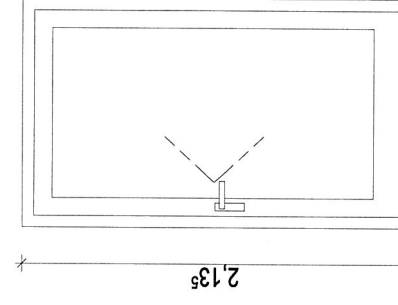

Pos. 01.009
Getränke, Vorrat
nach innen öffnend

BAUVORHABEN Wiederaufbau eines Vereinsheims mit Multifunktionsraum und Nebenräumen nach Abbruch sowie Errichtung eines Geräteschuppens mit seitlicher Überdachung Johannishofer Straße 18, 96173 Oberhaid		PLANVERFASSEN gleisner mahnel architekten Hainstraße 14 96047 Bamberg Tel. 09517200135 info@gleisner-mahnel.de		DATE 14.08.25
BAUHERR 1. Fußballclub Oberhaid 1928 e.V. Johannishofer Straße 18 96173 Oberhaid		PLANUNGSSITUATION Übersicht Eingangstüren Außenansicht		MASSSTAB 1:20
				PLAN NR.

[illegible][illegible]

21.05.2025
W. Schmidt
