

MONTAGE-AUFTRAG vom 06.11.2025

Nr. 250556

Firma: Lintner, Moritz
Frau / Herrn Moritz Lintner
Bauvorhaben: Kellerstr. 34, 96123 Pödelndorf
Kommission: WHG Kellergeschoss - FE, Rollo, AFB

Telefon: 0151 42262528

Ansprechpartner: Brian Hohmann
Tel: 0951/ 70080-17

Montagetermin:

DIENSTAG
11/11/25

Kostenstelle: T1872
Aufmaßtechniker: Werner Schmidt

Max. Montagezeit:

BAUSTELLENADRESSE:

Lintner, WHG KG FE/RO/AFB
Kellerstr. 34
96123 Litzendorf
Tel.: 09505

Montage Saffer
Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 38,40 m
Stückzahl: 13 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: JESUS VEGA am 06.11.2025

Bemerkungen / Zubehör:

FE-MONTAGE IM KG

FE + MATERIAL BEI UNS ABHOLEN AM
DIENSTAG FRÜH!

Lagerbestellungen

	Stk.
FENSTER UNILUX	7x
ROLLO PANZER ROTA	7x
SOMFY MOTOR	7x
ANNON ROLLODECKEL	

Baustellenanlieferung

Stk.
-
-
-
-
-
-
-

Sonstiges

Bautür

Bauschild

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Kellerstr. 34, 96123 Pödelndorf
Baustellenadresse: 96123 Litzendorf Kellerstr. 34
Auftrag Nr.: 250556
Kommission: WHG Kellergeschoss - FE, Rollo, AFB
Bauherr: Moritz Lintner, Kellerstr.34, 96123 Litzendorf
Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Elemente sind funktionfähig übergeben:	_____	Ja / Nein
Fenstereinstellung überprüft:	_____	Ja / Nein
Rollladen-/ Raffstorefunktion überprüft:	_____	Ja / Nein
Alle Griffbolzen und Abdeckkappen vorhanden:	_____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaukleber entfernt:	_____	Ja / Nein
Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen:	_____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (____ Stk.) erfolgt an:	_____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben:	_____	Ja / Nein
Alle Innentüren geliefert und montiert:	_____	Ja / Nein
Alle Innentürgriffe montiert:	_____	Ja / Nein
Boden (Laminat, Fliesen, Parkett) bereits verlegt:	_____	Ja / Nein
Feuchtraumzargen ringsum versiegelt:	_____	Ja / Nein

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauherr/ Mieter/ Architekt

Unterschrift Monteur/ Firmenvertreter Magnat

Druckschrift:

Druckschrift:

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Montageanweisung



Kommission: BH_Lintner KG				Datum: 21.05.2025					
Auftragsnummer: 250556				Aufmaßtechniker: W.Schmidt					
Neubau	X	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür		Parkmöglichkeit	
		2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild		Lagerfläche	
Altbau	X	Demontage		Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand		Etage/Fahrstuhl	
		Demontage bauseits	X	Entsorgung Mulde Hof		Vlies		Bautreppe/Gerüst	
Montage nach Stand der Technik									
		<u>Außen</u>		<u>Mitte</u>		<u>Innen</u>		<u>Bemerkung</u>	
Oben				Iso-Bloco Reno 75/8-33					
Li / Re				Iso-Bloco Reno 75/8-33					
Unten Brüstung, bodentief mit Fenster- bank									
	X	Twinaktiv	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl			
Verleistung	X	innen 3-seitig		Innen 2-seitig		außen seitlich		Flachleiste 30 mm Farbe weiß	
Außenfensterbank									
				Alu mit Stockrahmen- dichtung	X				
Rollomontage									
Vorsatz	X		X	Panzer					
			X	Motoren					
Sturzkasten Bestand	X		X	Rollodeckel					

FS oben länger

BV:

Lintner BA2


Datum: 11.6. 2025



Seite: 1


Aufmaß Fenster Altbau

Pos. ① Raum: Bad

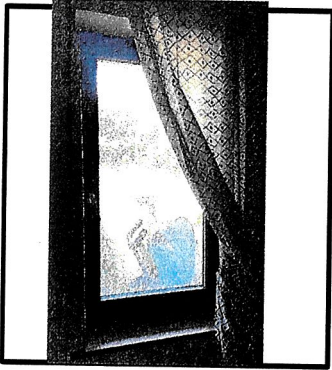

RV oben
RV

Bestellmaß:
1200 + BA 20 + BEP

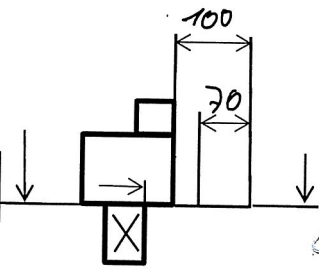


Höhe Innen:	1205	
Höhe Außen:	1240	
Rollo-deckel:	Alt	Neu
Fensterbank alt:	Überstand:	
NGM:	Gurtblende:	
Versatz:	unten	oben
Rollo: VBR	Antrieb: G ☐ M ☒ 666x1350 Panzer	

Bestellmaß: 680


Breite Innen: 695

Breite Außen: 700


Fensterbank Außen Neu: 740 x 165



FS Summ ausrücken
Fliesen bleiben




Pos. ② Raum: Büro



RV oben
RV

Bestellmaß:
1205 + BA 20 + BEP




Höhe Innen:	1210	
Höhe Außen:	1240	
Rollo-deckel:	Alt	Neu
Fensterbank alt:	Überstand:	
NGM:	Gurtblende:	
Versatz:	unten 20	oben 10
Rollo: VBR	Antrieb: G ☐ M ☒ 1400x1350	

Bestellmaß: 1425

Breite Innen: 1455

Breite Außen: 1450

Fensterbank Außen Neu: 1690 x 165





BV:

Datum: 202

Seite:

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 3		Raum: Wohnen	
		RV oben RV <u>Bestellmaß:</u> 2015 + BA + BEP	
<u>Bestellmaß:</u> 825 Breite Innen: 835 bis IFB 10mm Breite Außen: 825		Höhe Innen: 2020 Höhe Außen: 2040 Rollo-deckel: Alt Neu Fensterbank alt: Überstand: NGM: Gurtblende: Versatz: unten oben Rollo: VBR Sturz Antrieb: G ☐ M ☐ 790 x 2150	
Fensterbank Außen Neu:			
ohne Flachselle, im Boden versenken			
Pos. 4		Raum: Wohnen	
		RV oben RV 30 links <u>Bestellmaß:</u> 1135 + BA 20 + BEP	
<u>Bestellmaß:</u> 30 + 1475 Breite Innen: 1515 bis IFB Breite Außen:		Höhe Innen: 1140 Höhe Außen: 1165 Rollo-deckel: Alt Neu Fensterbank alt: Überstand: NGM: Gurtblende: Versatz: unten oben Rollo: VBR Sturz Antrieb: G ☐ M ☐ 1440 x 1300	
Fensterbank Außen Neu: 1550 x 165			

BV:

Datum: _____ 202

Seite:

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 15 Raum: Wohnen

RV oben
RV

Bestellmaß:

1205

 + BA 30
+ BEP

Höhe Innen:	1210	
Höhe Außen:	1245	
Rollo-deckel:	Alt	Neu
Fenster-bank alt:	Überstand:	
NGM:	Gurtblende:	
Versatz:	unten	oben
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐ 1915 x 1350	

Bestellmaß: 1950

Breite Innen:	1960
Breite Außen:	1950

Fensterbank Außen Neu:	1950 x 165
------------------------	------------

Pos. 16 Raum: Küche

RV oben
RV

Bestellmaß:

1205

 + BA 30
+ BEP

Höhe Innen:	1210	
Höhe Außen:	1235	
Rollo-deckel:	Alt	Neu
Fenster-bank alt:	Überstand:	
NGM:	Gurtblende:	
Versatz:	unten	oben
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐ 1420 x 1350	

Bestellmaß: 1455

Breite Innen:	1475
Breite Außen:	1455

Fensterbank Außen Neu:	1495 x 165
------------------------	------------








BV:

Datum: _____ 202

Seite:

Aufmaß Fenster Altbau

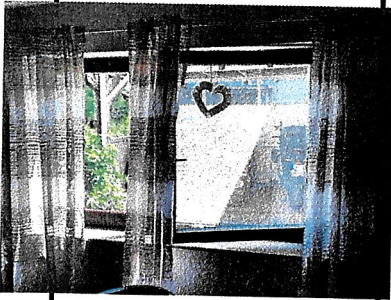

Pos. ②	Raum: <u>Schlafen</u>																						
	RV oben RV	<table border="1"> <tr> <td>Höhe Innen:</td> <td colspan="2">1210</td> </tr> <tr> <td>Höhe Außen:</td> <td colspan="2">1240</td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td>Alt</td> <td>Neu</td> </tr> <tr> <td>Fenster-bank alt:</td> <td colspan="2">Überstand:</td> </tr> <tr> <td>NGM:</td> <td colspan="2">Gurtblende:</td> </tr> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> </tr> <tr> <td>Rollo: VBR Sturz</td> <td colspan="2">Antrieb: G ☐ M ☐ 1915 x 1350</td> </tr> </table>	Höhe Innen:	1210		Höhe Außen:	1240		Rollo-deckel:	Alt	Neu	Fenster-bank alt:	Überstand:		NGM:	Gurtblende:		Versatz:	unten	oben	Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐ 1915 x 1350	
	Höhe Innen:	1210																					
Höhe Außen:	1240																						
Rollo-deckel:	Alt	Neu																					
Fenster-bank alt:	Überstand:																						
NGM:	Gurtblende:																						
Versatz:	unten	oben																					
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐ 1915 x 1350																						
<u>Bestellmaß:</u> 1205 + BA 30 + BEP																							
<table border="1"> <tr> <td><u>Bestellmaß:</u></td> <td>1950</td> </tr> <tr> <td>Breite Innen:</td> <td>1970</td> </tr> <tr> <td>Breite Außen:</td> <td>1945</td> </tr> </table>	<u>Bestellmaß:</u>	1950	Breite Innen:	1970	Breite Außen:	1945	<table border="1"> <tr> <td>Fensterbank Außen Neu:</td> <td>1990 x 165</td> </tr> </table>	Fensterbank Außen Neu:	1990 x 165														
<u>Bestellmaß:</u>	1950																						
Breite Innen:	1970																						
Breite Außen:	1945																						
Fensterbank Außen Neu:	1990 x 165																						
																							
Pos.	Raum:																						
	RV oben RV	<table border="1"> <tr> <td>Höhe Innen:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Höhe Außen:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td>Alt</td> <td>Neu</td> </tr> <tr> <td>Fenster-bank alt:</td> <td colspan="2">Überstand:</td> </tr> <tr> <td>NGM:</td> <td colspan="2">Gurtblende:</td> </tr> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> </tr> <tr> <td>Rollo: VBR Sturz</td> <td colspan="2">Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> </table>	Höhe Innen:			Höhe Außen:			Rollo-deckel:	Alt	Neu	Fenster-bank alt:	Überstand:		NGM:	Gurtblende:		Versatz:	unten	oben	Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐	
	Höhe Innen:																						
Höhe Außen:																							
Rollo-deckel:	Alt	Neu																					
Fenster-bank alt:	Überstand:																						
NGM:	Gurtblende:																						
Versatz:	unten	oben																					
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐																						
<u>Bestellmaß:</u> + BA + BEP																							
<table border="1"> <tr> <td><u>Bestellmaß:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite Innen:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite Außen:</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Bestellmaß:</u>		Breite Innen:		Breite Außen:		<table border="1"> <tr> <td>Fensterbank Außen Neu:</td> <td></td> </tr> </table>	Fensterbank Außen Neu:															
<u>Bestellmaß:</u>																							
Breite Innen:																							
Breite Außen:																							
Fensterbank Außen Neu:																							

Per Mail an Lohrer

Bestellung Alufensterbänke bei Fa. Ammon

MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstraße 1, 96052 Bamberg

Tel.: 0951 700 800

Kommission: <i>ZH-Lintner KG</i>		Liefertermin: KW <i>41</i>
Besteller:	W. Schmidt, Durchwahl -27 wernerschmidt@magnat-fenster.de	Datum: <i>24.9.25</i>
Zum Angebot:		Auftragsnummer: <i>250556</i>

Ausladungen: 50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400

Oberflächen: EV1, Mittelbronze c33, Dunkelbronze c34, RAL

Abschlüsse:

KF 400



MF 400



BF 4006



BF 4004




Fensterbankhalter RV 4/40 - 150-195 / 280-210 / 370 (300-400) / 470 (420-500)

Länge in mm, inkl. Bordstücke oder Stossverbinder!

Pos.	Menge	Länge	Ausladung	Oberfläche	Gleitab- schluss	Antidröhn geklebt
1	1	740	165	EV1	X	
2	1	1490	165		X	
3	1	1550	165		X	
4	2	1990	165		X	
5	1	1495	165		X	
6					X	X
7					X	X
8					X	X
9					X	X

Bordstücke montiert, UD 400-1 geklebt

		Niederhalter RP-KSI mit Schiebestücke 150	
		Niederhalter RV KSI 4/40- mit Schiebestücke	

Auftragsnummer:		250556		Kommission:		BH_Lintner KG -FE,RO,AFB		Lager
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:	
Fenster	Kömmerring 76mm	7	Unilux			42		
Fenstergriff	Magnat F9	7	Lager					
AFB		6	Ammon					
Rollo								
Rollopanzer	CD 37	7	Roma					
Rollomotor		7	Somfy					
Motorlager								
Kastendeckel			Ammon					
Lager	Doppelbocklager	1	Lager					
Welle								
Teleskopwelle mit Kapsel	Ja	7	Lager					
Rollkastendämmung	Flex-Schaumisolierung 20mm	3m	Lager					
Zubehör								
Verleistung Innen	Flach weiß 30mm	30m	Lager					
Montagematerial								
Montageband li+re	Iso-Bloco Reno 75/8-33	20m	Lager					
Folie unten	Twin Aktiv 70mm	10m	Lager					
Montageschaum	Pistolenschaum 1K	3	Lager					
Primer	Sprühprimer	1	Lager					

Auftragsnummer:		250556		Kommission:		BH_Lintner KG -FE,RO,AFB			Lager
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:		
Montageschrauben	AMO 7,5x152	50	Lager						
Fensterbankschrauben	3,9x25 Natur	20	Lager						
Sonstiges									
Acryl	Illbruck LD701 Strukturacryl	3	Lager						
