

RC2 Montage im EG

Rollokasten dämmen

BV:

241387 SP-Horn

Datum:

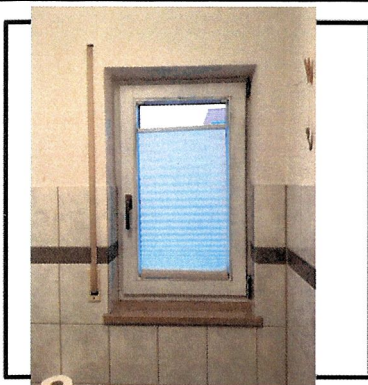
17.12.2024

Seite: 1

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 1 Raum: Gäste WC



Bestellmaß:

580x985

+ FBA 25
+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	600	585
Höhe:	995	1010

Versatz:	unten -15	oben 0	seite 0
AFB:	Laibung 70		
IFB:			
Rollo- deckel:	90		
Gurt-wickler:	105		
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☒ M ☐		
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

RC2

Pos. 2 Raum: Treppenhaus

55 80 80



Bestellmaß:

965x1180

+ FBA 25
+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	985	960
Höhe:	1200	1210

Versatz:	unten -20	oben 10	seite 15
AFB:	Laibung 230		
IFB:			
Rollo- deckel:			
Gurt-wickler:			
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐		
Verglasung:	Trav Satinato		
RV:	unten	oben	seite

BV:

241387 SP-Horn

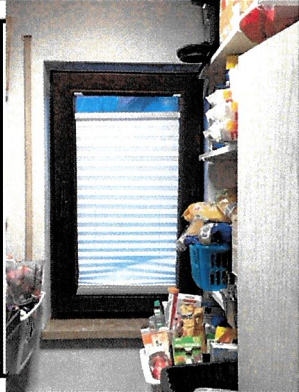
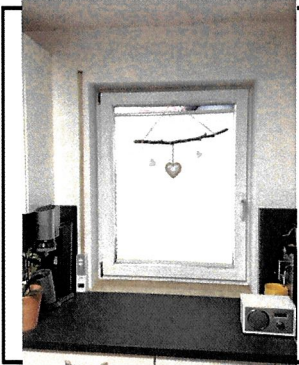
Datum:

17.12.2024



Seite: 2

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	3	Raum:	Speisekammer	Pos14																																												
																																																
Bestellmaß: 595x980 + FBA <u>25</u> + BEP _____																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>615</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>990</td> <td>1015</td> </tr> </table>						Innen:	Außen:	Breite:	615	590	Höhe:	990	1015																																			
	Innen:	Außen:																																														
Breite:	615	590																																														
Höhe:	990	1015																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">Laibung 70</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">90</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">105</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Versatz:	unten	oben	seite		-15	0	15	AFB:	Laibung 70			IFB:				Rollo-deckel:	90			Gurt-wickler:	105			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																													
	-15	0	15																																													
AFB:	Laibung 70																																															
IFB:																																																
Rollo-deckel:	90																																															
Gurt-wickler:	105																																															
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																															
VBR Sturz																																																
Verglasung:																																																
RV:	unten	oben	seite																																													
RC2																																																
Pos.	4	Raum:	Küche	Pos13																																												
																																																
Bestellmaß: 955x1235 + FBA <u>25</u> + BEP _____																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>975</td> <td>965</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1245</td> <td>1265</td> </tr> </table>						Innen:	Außen:	Breite:	975	965	Höhe:	1245	1265																																			
	Innen:	Außen:																																														
Breite:	975	965																																														
Höhe:	1245	1265																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-15</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">Laibung 70</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">90</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Versatz:	unten	oben	seite		-15	0	5	AFB:	Laibung 70			IFB:				Rollo-deckel:	90			Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																													
	-15	0	5																																													
AFB:	Laibung 70																																															
IFB:																																																
Rollo-deckel:	90																																															
Gurt-wickler:																																																
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																															
VBR Sturz																																																
Verglasung:																																																
RV:	unten	oben	seite																																													
RC2																																																

BV:

241387 SP-Horn

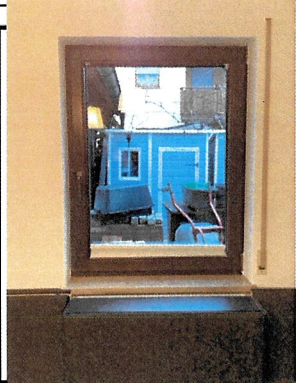
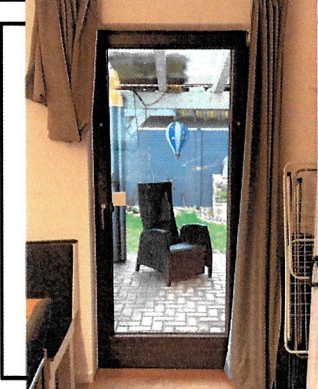
Datum:

17.12.2024



Seite: 3

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	5	Raum:	Essen	Pos12
	Bestellmaß: 955x1235 + FBA <u>25</u> + BEP _____			Versatz: unten oben seite -15 0 5
				AFB: Laibung 70
				IFB:
				Rollo-deckel: 90
				Gurt-wickler: 105
				Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz
				Verglasung:
				RV: unten oben seite
RC2				
Pos.	6	Raum:	Essen	Pos11
	Bestellmaß: 955x2160 + FBA _____ + BEP <u>100</u>			Versatz: unten oben seite -100 -5 5
				AFB:
				IFB:
				Rollo-deckel: 90
				Gurt-wickler: 105
				Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz
				Verglasung:
				RV: unten oben seite
RC2, IS Drehtür im Zargenrahmen selbstschließend				

BV:

241387 SP-Horn

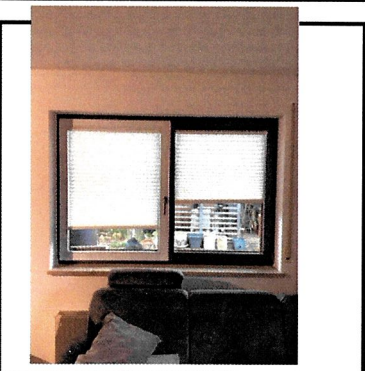
Datum:

17.12.2024

Seite: 4

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 7	Raum: Wohnen	Pos10								
	Bestellmaß: 1835x2160 + FBA _____ + BEP 100	Versatz: unten oben seite -105 0 5 AFB: IFB: Rollo-deckel: 90 Gurt-wickler: 105 Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz Verglasung: RV: unten oben seite								
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1855</td> <td>1840</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>2165</td> <td>2270</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	1855	1840	Höhe:	2165	2270
	Innen:	Außen:								
Breite:	1855	1840								
Höhe:	2165	2270								
RC2, IS Schiebetür z Schiene oben unten										
AAS										
Pos. 8	Raum: Wohnen	Pos9								
	Bestellmaß: 1835x1240 + FBA 25 + BEP _____	Versatz: unten oben seite -15 0 15 AFB: Laibung 75 IFB: Rollo-deckel: 90 Gurt-wickler: 105 Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz Verglasung: RV: unten oben seite								
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1855</td> <td>1825</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1255</td> <td>1275</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	1855	1825	Höhe:	1255	1275
	Innen:	Außen:								
Breite:	1855	1825								
Höhe:	1255	1275								
AAS AAS										
RC 2										

BV:

241387 SP-Horn

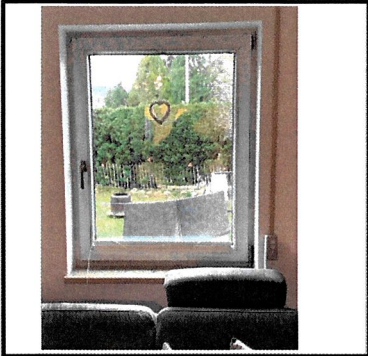
Datum:

17.12.2024



Seite: 5

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 9	Raum: Wohnen	Pos8	120	115									
		Bestellmaß: 955x1235 + FBA 25 + BEP _____	Versatz: unten oben seite -15 0 15										
			AFB: Laibung 75										
			IFB:										
			Rollo-deckel: 90										
			Gurt-wickler:										
			Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐										
			VBR Sturz										
			Verglasung:										
			RV: unten oben seite										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>980</td> <td>955</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1245</td> <td>1270</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	980	955	Höhe:	1245	1270			
	Innen:	Außen:											
Breite:	980	955											
Höhe:	1245	1270											
Öffnung wird angepasst													
RC 2													
Pos. 10	Raum: OG Kind1	Pos3											
		Bestellmaß: 955x1190 + FBA 25 + BEP _____ Inkl. Kasten	Versatz: unten oben seite -35										
			AFB:										
			IFB:										
			Rollo-deckel:										
			Gurt-wickler:										
			Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐										
			VBR Sturz Aufsatzkasten										
			Verglasung:										
			RV: unten oben seite										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>980</td> <td>1005</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1205 mit Ka</td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	980	1005	Höhe:	1205 mit Ka				
	Innen:	Außen:											
Breite:	980	1005											
Höhe:	1205 mit Ka												
Schindeln und Außenblech bleiben Anschluß Bauseits													

BV:

241387 SP-Horn

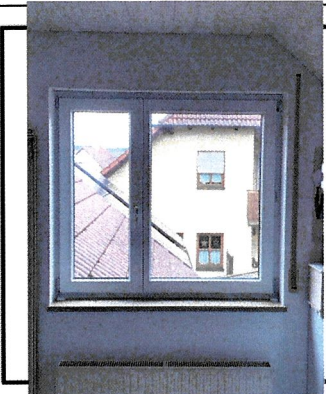
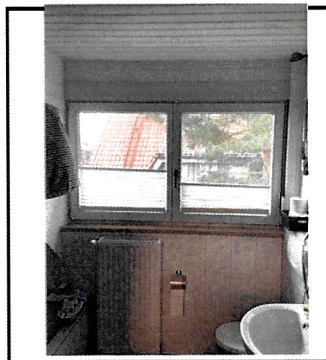
Datum:

17.12.2024



Seite: 6

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 11	Raum: OG Schlafen	Pos4									
			Bestellmaß: 1330x1235 + FBA 25 + BEP _____								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1350</td> <td style="text-align: center;">1330</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">1245</td> <td style="text-align: center;">1260</td> </tr> </table>				Innen:	Außen:	Breite:	1350	1330
	Innen:	Außen:									
Breite:	1350	1330									
Höhe:	1245	1260									
			Versatz: unten oben seite -15 5 10								
			AFB:	Laibung 70							
			IFB:								
			Rollo-deckel:	90							
			Gurt-wickler:	105							
			Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☒ M ☐							
			Verglasung:								
			RV:	unten oben seite							
Pos. 12	Raum: OG Bad	Pos5									
			Bestellmaß: 1830x1190 + FBA 25 + BEP _____ Inkl. Kasten								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1850</td> <td style="text-align: center;">1885</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">1200 inkl. Ka</td> <td></td> </tr> </table>				Innen:	Außen:	Breite:	1850	1885
	Innen:	Außen:									
Breite:	1850	1885									
Höhe:	1200 inkl. Ka										
			Versatz: unten oben seite -40								
			AFB:								
			IFB:								
			Rollo-deckel:								
			Gurt-wickler:								
			Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☒ M ☐							
			Verglasung:	Aufsatz Solar Wandsender							
			RV:	unten oben seite							
Schindeln und Außenblech bleiben Anschluß Bauseits											
Kastenhöhe 130											

BV:

Datum:

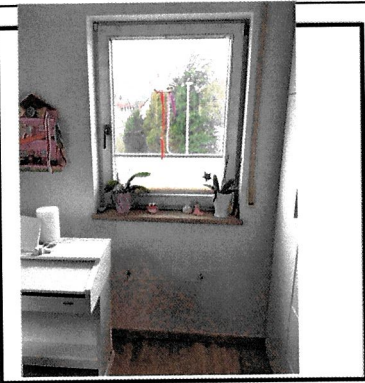
241387 SP-Horn

17.12.2024

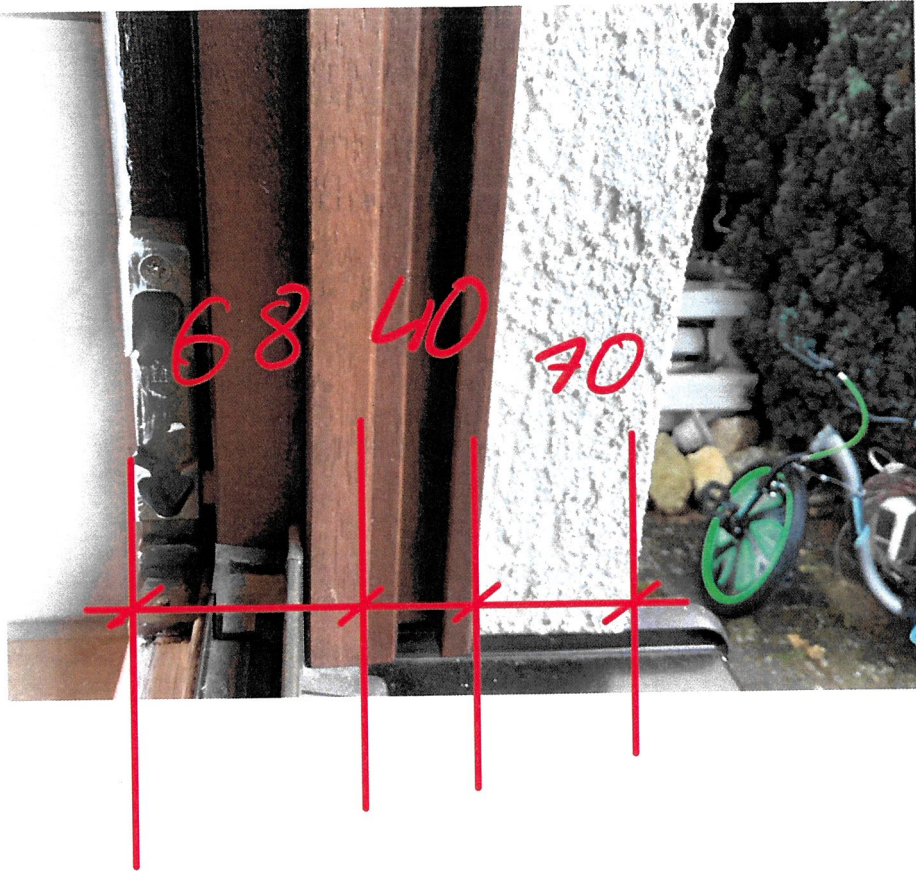


Seite: 7

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	13	Raum:	OG Kind2	Pos6												
 Bestellmaß: 955x2160 + FBA + BEP 50 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Innen:</th> <th>Außen:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breite:</td> <td>985</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>2165</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	985	960	Höhe:	2165		Versatz: <table border="1"> <thead> <tr> <th>unten</th> <th>oben</th> <th>seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	unten	oben	seite		0	10
		Innen:	Außen:													
	Breite:	985	960													
	Höhe:	2165														
	unten	oben	seite													
		0	10													
	AFB:	Laibung 70														
	IFB:															
	Rollo-deckel:	90														
	Gurt-wickler:	105														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐															
VBR Sturz																
Verglasung:																
RV:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>unten</th> <th>oben</th> <th>seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	unten	oben	seite												
unten	oben	seite														
Brüstung von uns entfernen <i>WIRD BAUSEITIG ENTFERNT</i> Gerüst, Einputzarbeiten Bauseits																
Pos.	14	Raum:	OG Kind3	Pos7												
 Bestellmaß: 955x2160 + FBA + BEP 50 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Innen:</th> <th>Außen:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breite:</td> <td>980</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>2155</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	980	950	Höhe:	2155		Versatz: <table border="1"> <thead> <tr> <th>unten</th> <th>oben</th> <th>seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	unten	oben	seite		0	10
		Innen:	Außen:													
	Breite:	980	950													
	Höhe:	2155														
	unten	oben	seite													
		0	10													
	AFB:	Laibung 70														
	IFB:															
	Rollo-deckel:	90														
	Gurt-wickler:	105														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐															
VBR Sturz																
Verglasung:																
RV:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>unten</th> <th>oben</th> <th>seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	unten	oben	seite												
unten	oben	seite														
Brüstung von uns entfernen <i>WIRD BAUSEITIG ENTFERNT</i> Gerüst, Einputzarbeiten Bauseits																

EG



Checkliste Material

Datum: 04.03.2025

Auftragsnummer:		241387		Kommission:		SP_FE,Rollo/ASR,AFB,JS			Lager
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware	geprüft:	
Fenster		14	Unilux	13.02.2025	20.02.2025	13			
Fenstergriff		13	Ammon	03.03.2025		12			
AFB		8	Ammon	03.03.2025		12			
Rollo									
Aufsatzrollo									
Rollopanzer/Zubehör		2	Roma	03.03.2025		12			
Kastendeckel	120mm	11	Roma	03.03.2025		12			
Rollokastendämmung	Flex-Schaumisolierung 10mm	2	Ammon	03.03.2025		12			
Montagematerial		1xRolle	Lager						
Folie unten									
Bodentieff Folie unten	Twin Aktiv 100mm	20lfm	Lager						
Komprimband	EPDM-Folie 250x1,2	5lfm	Lager						
Komprimband	illmod 10/1-2	20lfm	Lager						
Montageschaum	illmod 20/7-16	50lfm	Lager						
Montagekleber	Clearo PAG	7	Lager						
Montagekleber	illbruck SP351 anthrazit	1	Lager						
Primer	illbruck SP025 grau	2	Lager						
Montageschrauben	Sprühprimer	2	Lager						
Montageschrauben	AMO 7,5x182	30	Lager						
Fensterbankschrauben		150	BTI	03.03.2025					
Sonstiges	3,9x25 Natur	50	Lager						
Acryl									
	Illbruck LD701 Strukturacryl	5	Lager						

Checkliste Material

Datum: 04.03.2025

Auftragsnummer:		241387		Kommission:	SP_FE,Rollo/ASR,AFB,IS		Lager Ware geprüft:
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	
Silikon	transparent	3	Lager				
Silikon	weiß	3	Lager				

Montageanweisung



Kommission: SP_HornFE,Rollo/ASR,AFB,IS				Datum: 19.12.2024			
Auftragsnummer: 241387				Aufmaßtechniker: CW			
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür	Parkmöglichkeit	X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	Lagerfläche	X
Altbau	Demontage	X	Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand	Etage/Fahrstuhl	EG/OG
	Demontage bauseits		Entsorgung Mulde Hof	X	Vlies	X	Bautreppe/Gerüst
Montage nach Stand der Technik							
	Außen		Mitte		Innen		Bemerkung
Li / Re			Trioplex				
	Kompriband	X	Clearo PAG	X	Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fensterbank	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv		
	Twinaktiv	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl	X	
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl	X	
	bauseits		Schaum		Twinaktiv		
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband	X	Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen-dichtung		Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank	X	
Rollomontage							
Vorsatz			Panzer Bestand		Panzer	X	
Sturzkasten Bestand		X	Rollodeckel Bestand		Rollodeckel	X	
Rollozubehör			Rollogurt	X	DIHA Gurtdurchführung	X	
			Einlass-Gurtwickler	X	Blende	X	Größe: 105
					Schwenkwickler		Größe:
			Rollowelle		Doppelbocklager		
